

RAPORT DE EVALUARE FINALĂ A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ IAȘI SUD-VEST

VERSIUNE FINALĂ

STRUNGA, JUDEȚUL IAȘI

SEPTEMBRIE, 2025

Raport de evaluare

Cuprins

1	REZUMAT	4
2	INTRODUCERE	6
2.1.	Scopul evaluării.....	6
2.2.	Obiectivele evaluării.....	6
3.	INFORMAȚII GENERALE	8
3.1.	Informații despre GAL și activitatea GAL-ului.....	8
3.2.	Scurtă descriere a SDL, a măsurilor și a bugetului	9
	Obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Iași Sud-Vest	9
	Măsurile de finanțare și Domeniile de intervenție.....	10
	Modificările Strategiei De Dezvoltare Locală	11
	Evoluția alocării financiare a SDL.....	12
4.	CADRUL DE EVALUARE ȘI METODOLOGIA.....	15
4.1.	Prezentarea cadrului de evaluare.....	15
4.2.	Metode și tehnici - Aspecte generale.....	21
5.	ANALIZA DE ANSAMBLU A EFICACITĂȚII SDL.....	23
5.1	Eficacitatea financiară a măsurilor la nivel de SDL.....	23
5.2.	Eficacitatea SDL, la nivel de domeniu de intervenție	25
5.3.	Analiza indicatorilor de monitorizare	28
6.	RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRILE DE EVALUARE	29
	TEMA DE EVALUARE (1): LOGICA DE INTERVENȚIE A STRATEGIEI	29
	TEMA DE EVALUARE (2): CONTRIBUȚIA SDL LA ÎNTĂRIREA SECTORULUI AGRICOL.....	32
	TEMA DE EVALUARE (3): CONTRIBUȚIA SDL LA REDUCEREA DEPENDENȚEI POPULAȚIEI DE AGRICULTURĂ.....	38
	TEMA DE EVALUARE (4): CONTRIBUȚIA SDL LA DEZVOLTAREA UNEI INFRASTRUCTURI DE BAZĂ MODERNE.....	44
	TEMA DE EVALUARE (5): VALOAREA ADĂUGATĂ DATORATĂ METODEI LEADER.....	54
7	FACTORII DE SUCCES ȘI INSUCES.....	59
8.	CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI.....	61

PREFAȚĂ

Evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Iași Sud-Vest reprezintă o analiză aprofundată, cu caracter socio-economic, menită să identifice, să cuantifice și să demonstreze prin dovezi ceea ce s-a realizat, rezultatele obținute și schimbările generate, explicând principalele mecanisme care stau la baza acestor rezultate.

Evaluarea servește așadar la exprimarea aprecierilor cu privire la activitățile realizate sau în curs de realizare, cât sunt utile, eficace, eficiente sau sustenabile și analiza modului în care intervențiile realizate produc efecte sau nu.

Evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Iași Sud-Vest a fost realizată în perioada mai 2025 – august 2025 și reflectă progresul implementării strategiei la data de 31 august 2025.

Prin Decizia directorului executiv al Asociației GAL Iași Sud-Vest nr. 04 din 23.04.2025 s-a constituit Comitetul de coordonare a evaluării finale a Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Iași Sud-Vest format din următoarele persoane:

Numele și prenumele	Funcția în cadrul GAL	Rol în cadrul comitetului
Iuganu Viorel-Constantin	Expert monitorizare	Responsabil evaluare
Toma Elisabeta-Gabriela	Responsabil financiar	Membru
Bacalu Rodica	Președinte	Membru

Comitetul de coordonare al evaluării SDL include membri din cadrul GAL (angajați ai GAL sau dintre parteneri) ce pot aduce un aport semnificativ calității procesului de evaluare. Atribuțiile acestui Comitet se referă la sprijinirea și coordonarea activității, analizarea și avizarea raportului de evaluare.

Evaluarea și redactarea Raportului de evaluare s-a realizat intern de către echipa stabilită prin decizie. Evaluarea s-a făcut conform prevederilor din Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, versiunea 17 și a materialelor de instruire privind evaluarea intermediară și evaluarea finală.

Evaluarea SDL urmărește îmbunătățirea calității, relevanței (măsura în care obiectivele programate sunt în conformitate cu nevoile, problemele și diferite alte aspecte întâlnite în implementarea SDL), eficacității (măsura în care au fost îndeplinite obiectivele stabilite) și eficienței managementului implementării SDL (relația dintre resursele folosite și rezultatele obținute), precum și evaluarea menținerii relevanței și consistenței, la nivelul GAL, a strategiei în contextul schimbărilor socio-economice.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Iași Sud-Vest este responsabilă de activitățile de evaluare ale Strategiei de Dezvoltare Locală.

1 REZUMAT

Evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Iași Sud-Vest reflectă în termeni de eficacitate și eficiență progresul implementării strategiei de la data semnării contractului (09.11.2016) până în prezent, la data de 31.08.2025.

Obiectivul general al evaluării este analizarea impactului socio-economic a Strategiei de Dezvoltare Locală asupra dezvoltării durabile și echilibrate a teritoriului Asociației GAL Iași Sud-Vest.

Evaluarea corectă și obiectivă asigură creșterea responsabilității și transparenței implementării SDL, cu referire la autoritățile responsabile, la actorii implicați în managementul, coordonarea și promovarea SDL.

Obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Iași Sud-Vest:

- ✓ Întărirea sectorului agricol prin creșterea competitivității și eficienței exploatațiilor din interiorul GAL
- ✓ Reducerea dependenței populației de agricultură
- ✓ Creșterea bunăstării populației prin dezvoltarea unei infrastructuri de bază moderne

Informații generale privind SDL

În cadrul parteneriatului sunt în total 14 unități administrativ teritoriale din județele Iași (12) și Neamț (2) - 13 comune și 1 oraș.

Suprafața totală a teritoriului GAL este de 533,06 kmp acoperind 8,56% din suprafața județului Iași și 1,09% din suprafața județului Neamț.

Populația totală cuprinsă în teritoriul GAL este de 57.799 locuitori din care 47.956 locuitori (82,97%) sunt locuitori ai județului Iași și 9.843 locuitori (17,03%) sunt locuitori ai județului Neamț.

Inițial, Strategia de Dezvoltare a conținut un număr de 9 măsuri. Începând cu versiunea 11 a SDL a fost eliminată Măsura 4.

Pe parcursul implementării, Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Iași Sud-Vest a cunoscut **13 modificări**, iar împreună cu versiunea inițială, a totalizat un număr de 14 versiuni.

Cadrul de evaluare și metodologia

TEME DE EVALUARE:

- ☑ *Tema de evaluare 1: LOGICA DE INTERVENȚIE A STRATEGIEI*
- ☑ *Tema de evaluare 2: CONTRIBUȚIA SDL LA ÎNTĂRIREA SECTORULUI AGRICOL*
- ☑ *Tema de evaluare 3: CONTRIBUȚIA SDL LA REDUCEREA DEPENDENȚEI POPULAȚIEI DE AGRICULTURĂ*
- ☑ *Tema de evaluare 4: CONTRIBUȚIA SDL LA DEZVOLTAREA UNEI INFRASTRUCTURI DE BAZĂ MODERNE*
- ☑ *Tema de evaluare 5: VALOAREA ADĂUGATĂ DATORATĂ METODEI LEADER*

În procesul de evaluare a Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Iași Sud-Vest s-a utilizat un mix de metode și tehnici. Analiza s-a bazat, în limita posibilităților, pe **triangulația surselor de date și a metodelor și tehnicilor de evaluare utilizate**.

Analiza de ansamblu a eficacității SDL

8 din 9 măsuri au o eficacitate financiară ridicată cu un procent ce se apropie de 100% sau chiar depășește 100%. O măsură are un procent de eficacitate financiară redus.

Pe total SDL eficacitatea financiară este ridicată.

Eficacitatea pe fiecare domeniu de intervenție este ridicată.

Răspuns la întrebările de evaluare

Au fost detaliate răspunsurile la toate întrebările de evaluare

Strategia a sprijinit sectorul agricol în mare măsură.

Strategia a sprijinit sectorul non-agricol și creșterea competitivității firmelor din sectorul non-agricol în mare măsură.

Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Iași Sud-Vest a sprijinit dezvoltarea unei infrastructuri de bază moderne în mare măsură.

În urma analizei efectuate considerăm că succesul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Iași Sud-Vest s-a datorat respectării principiilor LEADER.

Factorii de succes și eșec

Rezultate implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Iași Sud-Vest au fost influențate de factori interni și externi, cei mai importanți fiind:

- Respectarea principiilor LEADER
- Calitatea animării
- Funcționarea parteneriatului, inclusiv a CD și CS
- Experiența exercițiului anterior
- Imaginea GAL în teritoriu

Considerăm că o importanță majoră privind succesul Strategiei de Dezvoltare Locală a fost respectarea principiilor LEADER și calitatea animării încă de la faza elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală. Actorii locali din teritoriul GAL Iași Sud-Vest au fost implicați activ în luarea deciziilor, în participarea cu idei și sugestii.

Concluzii și recomandări

La data redactării Raportului de evaluare toate proiectele sunt implementate și finalizate.

- ✓ Teritoriul a manifestat un interes foarte mare pentru modernizarea și re tehnologizarea sectoarelor agricol și non-agricol.
- ✓ Alocările financiare au fost insuficiente comparativ cu cererea teritoriului, atât pentru sectorul agricol cât și pentru cel non-agricol.
- ✓ Segmentul de populație tânără (până în 40 de ani) și femeile sunt cei mai interesați de dezvoltarea și modernizarea afacerilor.
- ✓ Gradul de satisfacție a beneficiarilor în relația cu GAL este foarte ridicat.
- ✓ Implementarea strategiei s-a îndeplinit într-un procent de 100%, și a avut rezultate foarte bune în teritoriu.

2 INTRODUCERE

Structura capitolului:

2.1. Scopul raportului de evaluare

2.2. Structura raportului de evaluare

Evaluarea reprezintă o analiză intensă, limitată în timp, care examinează de o manieră sistematică și obiectivă relevanța, eficiența, eficacitatea, impactul, sustenabilitatea, performanța, succesul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Iași Sud-Vest și a proiectelor aflate în desfășurare sau finalizate. Evaluarea este cea care ne informează ce funcționează și ce nu funcționează și mai ales, de ce anume, și face recomandări pentru îmbunătățirea activităților viitoare.

2.1. Scopul evaluării

Scopul final al Evaluării SDL este de a asigura creșterea responsabilității și transparenței implementării SDL, cu referire la autoritățile responsabile, la actorii implicați în managementul, coordonarea și promovarea SDL, aflând cum au fost îmbunătățite implementarea și managementul pe parcurs. Prin evaluarea SDL se demonstrează rezultatele și realizările în urma implementării SDL și de asemenea, se pot proiecta și se pot cunoaște modalități de a pune în practică mai bine viitoarele activități ale GAL.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Iași Sud-Vest a planificat tematicile și activitățile de autoevaluare, aceasta realizându-se cu ajutorul întrebărilor de evaluare, a criteriilor de apreciere/evaluare și a indicatorilor elaborate de către GAL. Întrebările de evaluare au rolul de a stabili în ce măsură au fost îndeplinite obiectivele strategiei. Criteriile de apreciere indică gradul de reușită în îndeplinirea acestor obiective. Indicatorii sunt utilizați pentru a colecta dovezile necesare pentru a răspunde la întrebările de evaluare.

2.2. Obiectivele evaluării

Obiectivul general al evaluării este analizarea impactului socio-economic a Strategiei de Dezvoltare Locală asupra dezvoltării durabile și echilibrate a teritoriului Asociației GAL Iași Sud-Vest, precum și aprecierea eficacității și eficienței

Obiectivele specifice urmăresc:

- Cum și în ce măsură au fost obținute rezultatele planificate
 - Furnizarea datelor privind gradul de absorbție a fondurilor alocate Grupului de Acțiune Locală Iași Sud-Vest (raportat la proiectele selectate de GAL)
 - Evaluarea gradului în care proiectele prevăzute în SDL au fost contractate
 - Evaluarea gradului în care proiectele prevăzute în SDL au fost finalizate
- Cum și în ce măsură abordarea LEADER este eficientă comparativ cu alte instrumente

- Cum au fost utilizate resursele
- Care este percepția beneficiarilor, evaluarea gradului de satisfacție a beneficiarilor în relația cu GAL
- Ce funcționează bine și ce nu, evaluarea eficienței sistemului de implementare a SDL
- Cuantificarea indicatorilor din SDL în vederea evaluării gradului în care obiectivele preconizate au fost îndeplinite;
- Examinarea măsurii în care Strategia de Dezvoltarea Locală (priorități, obiective, domenii de intervenție, măsuri) a fost în continuare relevantă și coerentă în contextul modificărilor socio-economice;
- Analiza progresului înregistrat în implementarea strategiei, atingerea obiectivelor și identificarea factorilor externi și interni care au o influență asupra performanțelor GAL și a celorlalți actori implicați în gestionarea și implementarea SDL;
- Identificarea lecțiilor învățate și a măsurilor necesare pentru realizarea obiectivelor SDL;

Factori (Actori) interesați de evaluarea SDL:

- Autoritatea de Management
- Principalii actori locali
- Partenerii din cadrul Asociației GAL Iași Sud-Vest
- Consiliul Director al Asociației GAL Iași Sud-Vest
- Echipa Asociației GAL Iași Sud-Vest
- Alte instituții publice (AFIR, etc)
- Instituții de presă specializate pe finanțări sau pe dezvoltarea mediului rural

Evaluarea oferă informații care merg dincolo de simpla constatare a nivelului de realizare a anumitor indicatori de monitorizare sau răspunsul la o serie de întrebări concrete. Evaluarea se considera un proces de învățare pentru toți actorii. Răspunsurile la întrebările de evaluare structurează informațiile de la particular la general.

Structura raportului de evaluare

Raportul de evaluare descrie rezultatele obținute în intervalul de referință și consemnează detaliile de natură tehnică, financiară și administrativă privind implementarea SDL.

Structura raportului respecta prevederile ghidului de evaluare și este următoarea:

Prefață – informații generale despre lucrare

1. Rezumat
2. Introducere
3. Informații generale privind SDL
4. Cadrul de evaluare și metodologia
5. Analiza de ansamblu a eficacității SDL
6. Răspuns la întrebările de evaluare
7. Factorii de succes și eșec

3. INFORMAȚII GENERALE

Structura capitolului

3.1. Informații despre GAL și activitatea GAL-ului

3.2. Scurtă descriere a SDL, a măsurilor și bugetului, inclusiv modificările de SDL și evoluția alocării financiare ca urmare a realocărilor financiare, bonusărilor etc.

3.1. Informații despre GAL și activitatea GAL-ului

Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Iași Sud-Vest este o Asociație nonguvernamentală formată din 61 de membri, reprezentând 14 parteneri din sectorul public (22,95%) și 47 de parteneri din sectorul privat și societatea civilă (77,05%). Aceasta a fost autorizată de Autoritatea de Management prin autorizația nr. 10/25.08.2016.

În cadrul parteneriatului sunt în total **14 unități administrativ teritoriale** din județele Iași și Neamț (13 comune și 1 oraș), distribuite astfel:

Județul Iași (11 comune și 1 oraș):

- Comuna Alexandru Ioan Cuza;
- Comuna Balș;
- Comuna Butea;
- Comuna Costești;
- Comuna Cucuteni;
- Comuna Hălăucești;
- Comuna Heleșteni;
- Comuna Mircești;
- Comuna Mogoșești-Siret;
- Comuna Ruginoasa;
- Comuna Strunga
- Orașul Târgu Frumos.

Județul Neamț (2 comune)

- Comuna Botești;
- Comuna Gherăești.

Începând cu versiunea 13 a SDL (ultima versiune la data scrierii prezentului raport) componența parteneriatului a fost modificată prin înlocuirea unor parteneri privați și parteneri societate civilă deoarece unii parteneri și-au încetat activitatea, s-au reorganizat sau nu au mai dorit să rămână în parteneriat. Numărul total al partenerilor a rămas același.

Teritoriul Asociației GAL Iași Sud-Vest este format dintr-un număr de 45 de localități.

Teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală Iași Sud-Vest este unul omogen geografic, economic și social. Acesta este situat în Regiunea de Nord Est a României și se întinde pe raza județelor Iași și Neamț, cuprinzând comunele din partea sud vestică a județului Iași și două comune din partea estică a județului Neamț.

Suprafața totală a teritoriului GAL este de 533,06 kmp acoperind 8,56% din suprafața județului Iași și 1,09% din suprafața județului Neamț.

Populația totală cuprinsă în teritoriul GAL este de 57.799 locuitori din care 47.956 locuitori (82,97%) sunt locuitori ai județului Iași și 9.843 locuitori (17,03%) sunt locuitori ai județului Neamț.

Gradul de ruralitate a teritoriului este unul pronunțat, respectiv de 81,88% - 47.324 locuitori în zona rurală. Densitatea populației la nivelul GAL este de 108,43 locuitori/kmp. Populația din GAL este multietnică și multiconfesională. Teritoriul este caracterizat de un grad de sărăcie pronunțat (9 din 14 unități administrativ teritoriale având IDUL sub 55% - subdezvoltat atât economic cât și ca infrastructură).

Din punctul de vedere al economiei, zona se bazează preponderent pe agricultură, serviciile și industria fiind slab reprezentate și dezvoltate.

Informații despre activitatea GAL – de scris.

3.2. Scurtă descriere a SDL, a măsurilor și a bugetului

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL (Grupul de Acțiune Locală) Iași Sud-Vest se bazează pe interacțiunea dintre agenți și proiecte din diverse sectoare ale economiei locale, cu scopul dezvoltării economiei rurale. Astfel se urmărește o acoperire amplă din punct de vedere teritorial și al populației, având în vedere că strategia se adresează unei zone cu mari necesități în sfera socială, economică și de mediu.

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Iași Sud-Vest a fost elaborată în perioada 2015 – 2016. Scrierea SDL a început în anul 2015 și s-a finalizat și înaintat al MADR AM-PNDR pe data de 11.04.2016.

Strategia de dezvoltare locală sprijină economia actuală și dezvoltă spiritul antreprenorial într-un spațiu rural propice economic și social.

Obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Iași Sud-Vest

Rezultatul analizei SWOT din momentul elaborării SDL a condus la identificarea unei serii de nevoi ce au putut defini cele trei obiective de atins de către SDL:

Obiectivul 1: Întărirea sectorului agricol prin creșterea competitivității și eficienței exploatațiilor din interiorul GAL

Obiectivul 2: Reducerea dependenței populației de agricultură

Obiectivul 3: Creșterea bunăstării populației prin dezvoltarea unei infrastructuri de bază moderne

O.1. Întărirea sectorului agricol prin creșterea competitivității și eficienței exploatațiilor din interiorul GAL

Teritoriul Asociației GAL Iași Sud Vest este unul eminent agricol. Dezvoltarea teritoriului prin prisma domeniului agricol este una constantă dar cu creștere înceată depinzând efectiv de rezultatele economice ale exploatațiilor agricole.

Atingerea obiectivului propus dorește să ducă la o întărire a agenților economici din GAL față de concurența externă, în special prin întărirea exploatațiilor mici și mijlocii. De asemenea se urmărește menținerea locurilor de muncă din sectorul agricol în primă perioadă dar și o creștere ușoară a acestora. Un efect al atingerii obiectivului este creșterea productivității printr-o utilizare judicioasă a terenurilor și prin implementarea de tehnologii de lucru eficiente și prietenoase cu mediul.

O.2. Reducerea dependenței populației de agricultură

Sectorul non agricol este slab dezvoltat la nivelul GAL nefiind o opțiune serioasă în acoperirea necesarului de locuri de muncă la nivelul GAL. Așa cum reiese din analiza diagnostic în GAL funcționează un număr de 514 agenți economici. La nivelul populației active 57,27% lucrează în agricultură restul de 42,73% în domenii non agricole. Dezvoltarea sectorului non agricol este o necesitate stringentă a teritoriului. GAL dispune de resurse pentru dezvoltarea sectorului non agricol (de ex. resurse naturale, patrimoniul istoric, cultural, de mediu etc) putând fi atât o atracție pentru populația din interior cât și pentru potențialii investitori din exterior. Atingerea obiectivului va crea și premisele de reîntoarcere a populației plecate în străinătate sau posibilitatea investirii capitalurilor acestora în zonă.

O.3. Creșterea bunăstării populației prin dezvoltarea unei infrastructuri de bază moderne

Scăderea decalajului dintre rural – urban este premisa dezvoltării rurale a teritoriului GAL. Crearea unor condiții cât mai aproape de confortul din orașe, va diminua dorința de migrare a populației dar în același timp va duce la o reîntoarcere a populației din străinătate. Dezvoltarea unei infrastructuri de bază moderne oferă suportul dezvoltării afacerilor. O infrastructură de bază bine pusă la punct presupune costuri de operare reduse, consumuri mici, posibilitatea respectării normelor sanitare, sanitar – veterinar și de mediu, oferind oportunitatea unor afaceri eficiente .

Măsurile de finanțare și Domeniile de intervenție

Pe parcursul implementării Strategiei De Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Iași Sud-Vest numărul de măsuri din strategie a variat, prin dispariția unei măsuri.

Inițial, Strategia de Dezvoltare a conținut un număr de 9 măsuri pe care le enumerăm mai jos:

- | | |
|----------|--|
| Măsura 1 | „Sprijin pentru exploatații agricole” |
| Măsura 2 | „Sprijin pentru constituirea și promovarea formelor asociative” |
| Măsura 3 | „Sprijin pentru afaceri non-agricole” |
| Măsura 4 | „Sprijin pentru activități turistice și recreative” |
| Măsura 5 | „Sprijin pentru punerea în valoare a patrimoniului local, meșteșugurilor și obiceiurilor locale” |

Măsura 6	„Sprijin pentru acțiuni de mediu”
Măsura 7	„Sprijin pentru înființarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii”
Măsura 8	„Sprijin pentru investiții în infrastructura socială”
Măsura 9	„Sprijin pentru integrarea minorităților locale”

Măsurile din SDL corespund următoarelor **domenii de intervenții**, codificarea măsurii conținând atât prescurtarea numărului măsurii, cât și prescurtarea domeniului de intervenție:

Tabel 1 Domenii de intervenții și măsuri

Domeniul de intervenție	Codificarea măsurii	Denumirea măsurii
DI 1.1. – Refacerea, conservarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și de mediu	M5 / DI 1.1.	„Sprijin pentru punerea în valoare a patrimoniului local, meșteșugurilor și obiceiurilor locale”
	M6 / DI 1.1.	„Sprijin pentru acțiuni de mediu”
DI 1.2 – Dezvoltarea infrastructurii locale	M7 / DI 1.2.	„Sprijin pentru înființarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii”
DI 1.3. - Încurajarea activităților pentru incluziune socială a grupurilor defavorizate și reducerea sărăciei	M8 / DI 1.3	„Sprijin pentru investiții în infrastructura socială”
	M9 / DI 1.3.	„Sprijin pentru integrarea minorităților locale”
DI 2.1 – Restructurarea și modernizarea sectorului agricol	M1 / DI 2.1	„Sprijin pentru exploatații agricole”
DI 2.2 – Încurajarea asocierii și schimbului de experiență între fermieri	M2 / DI 2.2.	„Sprijin pentru constituirea și promovarea formelor asociative”
DI. 3.1 – Diversificarea activităților economice	M3 / DI 3.1	„Sprijin pentru afaceri non-agricole”
	M4 / DI 3.1	„Sprijin pentru activități turistice și recreative”

La Modificarea SDL nr. 11 a fost eliminată Măsura 4 „Sprijin pentru activități turistice și recreative” din SDL – Notă de aprobare din data de 21.10.2021.

Modificările Strategiei De Dezvoltare Locală

Pe parcursul implementării, Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Iași Sud-Vest a cunoscut 13 modificări, iar împreună cu versiunea inițială, a totalizat un număr de 14 versiuni.

Au fost 4 modificări complexe (modificările 1, 2, 6 și 11), 5 modificări simple (modificările 3, 4, 5, 8 și 13) și 4 modificări legislative și/sau administrative (modificările 7,9, 10 și 12). Acestea, pe scurt, au vizat următoarele aspecte:

- **Modificare SDL versiunea 1 (30.05.2017)** – îndreptarea unor erori materiale

- **Modificare SDL versiunea 2 (26.01.2018)** – îndreptarea unor erori materiale, reîncadrare M2 din art. 27 în art. 17 din Reg. UE 1305/2013
- **Modificare SDL versiunea 3 (13.02.2018)** – realocarea unor sume între măsuri, sume rămase neutilizate
- **Modificare SDL versiunea 4 (29.06.2018)** – realocarea unor sume între măsuri, sume rămase neutilizate
- **Modificare SDL versiunea 5 (03.06.2019)** – realocarea unor sume între măsuri, sume rămase neutilizate din diferențe contractare și din rezilierea unui contract pe M4)
- **Modificare SDL versiunea 6 (19.06.2019)** – îndreptarea unor erori materiale (M4)
- **Modificare SDL versiunea 7 (19.04.2020)** – creștere alocare financiară ca urmare a bonusării
- **Modificare SDL versiunea 8 (29.07.2020)** – realocarea unor sume între măsuri, sume rămase neutilizate în urma unor economii la achiziții după finalizarea contractelor.
- **Modificare SDL versiunea 9 (12.07.2021)** – actualizare fișa măsurii M5 – valoarea ajutorului maxim pe proiect, corelat cu sumele rămase disponibile pe măsură.
- **Modificare SDL versiunea 10 (30.07.2021)** – creștere alocare financiară ca urmare a bonusării suplimentare.
- **Modificare SDL versiunea 11 (21.10.2021)** – a fost eliminată Măsura 4 din SDL, au fost realocate sume între măsuri.
- **Modificare SDL versiunea 12 (28.07.2022)** – au fost realocate sume între măsuri, a crescut alocarea financiară datorită fondurilor alocate din FEADR Tranzitie și a celor alocate din EURI.
- **Modificare SDL versiunea 13 (13.03.2023)** – Modificarea componenței parteneriatului prin înlocuirea unor parteneri privați și societate civilă. Numărul partenerilor a rămas același.

Evoluția alocării financiare a SDL

a) Alocarea financiară a SDL

Alocarea financiară inițială (începând cu versiunea inițială a SDL – până la SDL versiunea modificată 6)

Bugetul total al strategiei este de **2.351.543,31 euro**, repartizat astfel:

- 1.881.374,12 euro – Măsura 19.2 – „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”
- 470.169,149 euro – Măsura 19.4 – „Cheltuieli de funcționare și animare”

Bugetul actualizat ca urmare a bonusării (începând cu versiunea modificată 7 – până la versiunea modificată 9)

Bugetul total al strategiei este de **2.540.894,82 euro**, repartizat astfel:

- **2.032.969,94** euro – Măsura 19.2 – „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”
- **507.924,88** euro – Măsura 19.4 – „Cheltuieli de funcționare și animare”

Bugetul actualizat ca urmare a bonusării suplimentare (începând cu versiunea modificată 10 – până la versiunea modificată 11)

Bugetul total al strategiei este de **2.686.841,82 euro**, repartizat astfel:

- **2.149.742,13** euro – Măsura 19.2 – „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”
- **537.099,69** euro – Măsura 19.4 – „Cheltuieli de funcționare și animare”

Bugetul actualizat ca urmare a alocării fondurilor din FEADR Tranziție și din EURI (începând cu versiunea modificată 12 – până la versiunea modificată 13 – versiunea curentă)

Bugetul total al strategiei este de **3.218.220,95 euro**, repartizat astfel:

DIN FONDURI FEADR

- **2.454.902,86** euro – Măsura 19.2 – „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”
- **643.322,37** euro – Măsura 19.4 – „Cheltuieli de funcționare și animare”

DIN FONDURI EURI

- **119.995,72** euro – Măsura 19.2 – „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”

b) Alocarea financiară pe măsuri, în funcție de versiunea SDL

Tabel 2 Alocarea financiară pe măsuri în funcție de versiunea SDL (sume exprimate în euro)

ALOCARE FINANCIARĂ SDL – de la versiunea inițială până la versiunea 13									
Măsura	SDL inițial, SDL 1, SDL 2	SDL 3	SDL 4	SDL 5, SDL 6	SDL 7 (bonusare)	SDL 8, SDL 9	SDL 10 (bonusare suplimentară)	SDL 11	SDL 12, Alocare FEADR Tranziție + EURI SDL 13
Măsura 1	599.649,72	652.739,50	652.738,00	722.710,10	874.305,92	872.710,10	989.482,29	989.482,29	1.154.643,02
Măsura 2	30.000,00	30.000,00	27.125,00	27.125,00	27.125,00	27.125,00	27.125,00	27.125,00	27.125,00
Măsura 3	200.000,00	198.157,50	212.948,52	210.959,91	210.959,91	210.959,91	210.959,91	232.792,53	352.788,25
Măsura 4	123.479,34	79.965,00	79.965,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	0,00	0,00
Măsura 5	30.000,00	30.000,00	27.684,60	27.684,60	27.684,60	39.358,45	39.358,45	39.358,45	39.300,55
Măsura 6	90.000,00	118.806,12	118.652,00	118.427,90	118.427,90	118.427,00	118.427,90	118.427,90	113.517,66
Măsura 7	648.245,06	611.709,00	602.264,00	599.475,61	599.475,61	589.397,58	589.397,58	589.397,58	738.220,60
Măsura 8	60.000,00	59.997,00	59.997,00	59.997,00	59.997,00	59.997,00	59.997,00	59.997,00	56.142,12

Măsura 9	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	93.161,38	93.161,38
TOTAL	1.881.374,12	1.881.374,12	1.881.374,12	1.881.374,12	2.032.969,94	2.032.969,04	2.149.742,13	2.149.742,13	2.574.898,58

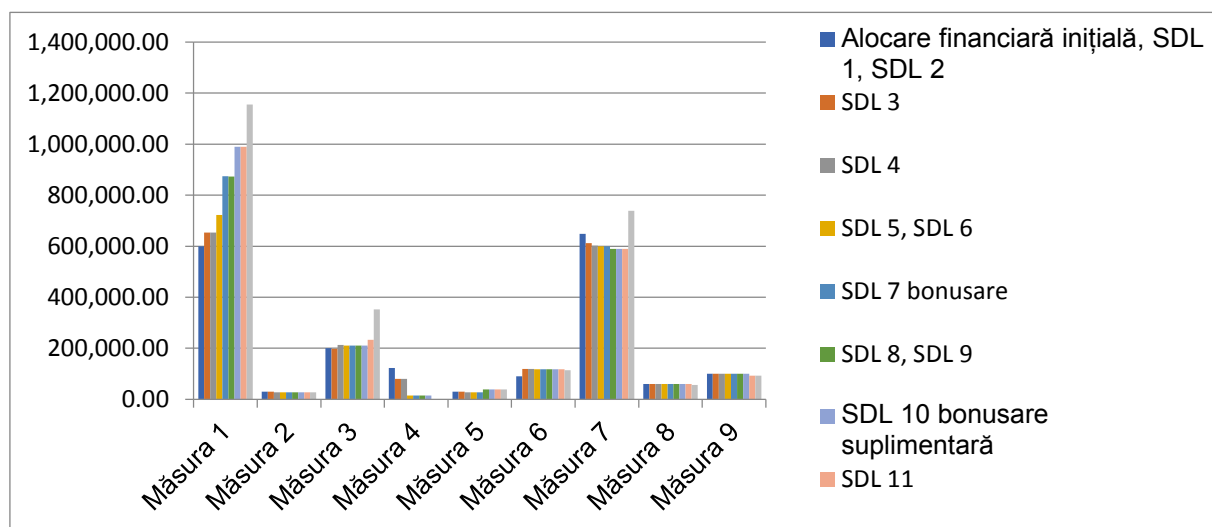



Figura Alocarea financiară și variația pe măsuri în funcție de versiunea SDL

Alocarea financiară pe măsuri, în ultima versiune a SDL (SDL 13). Ultima modificare financiară a fost realizată în SDL versiunea 12.

Tabel 3 Măsurile de finanțare și alocarea financiară pe măsuri

Domeniul de intervenție	CODIFICAREA MĂSURII	Măsura	Alocarea totală / măsură	Procent alocare financiară din total SDL
P. 1. Reducerea decalajelor rural-urban	M5/DI 1.1.	„Sprijin pentru punerea în valoare a patrimoniului local, meșteșugurilor și obiceiurilor locale”	39.300,55	1,53%
	M6/ DI 1.1.	„Sprijin pentru acțiuni de mediu”	113.517,66	4,41%
	M7/ DI 1.2.	„Sprijin pentru înființarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii”	738.220,60	28,67%
	M8/ DI 1.3.	„Sprijin pentru investiții în infrastructura socială”	56.142,12	2,18%
	M9/ DI 1.3.	„Sprijin pentru integrarea minorităților locale”	93.161,38	3,62%
P.2. Promovarea de metode și tehnici de eficientizare a activităților exploatațiilor agricole	M1/DI 2.1.	„Sprijin pentru exploatații agricole”	1.154.643,02	44,84%
	M2/DI 2.2	„Sprijin pentru constituirea și promovarea formelor asociative”	27.125,00	1,05%
P.3. Stimularea activităților non-agricole	M3/DI 3.1.	„Sprijin pentru afaceri non-agricole”	352.788,25	13,70%
	M4/DI 3.1.	„Sprijin pentru activități turistice și	0	0%

	recreaționale"		
TOTAL		2.574.898,58	100%

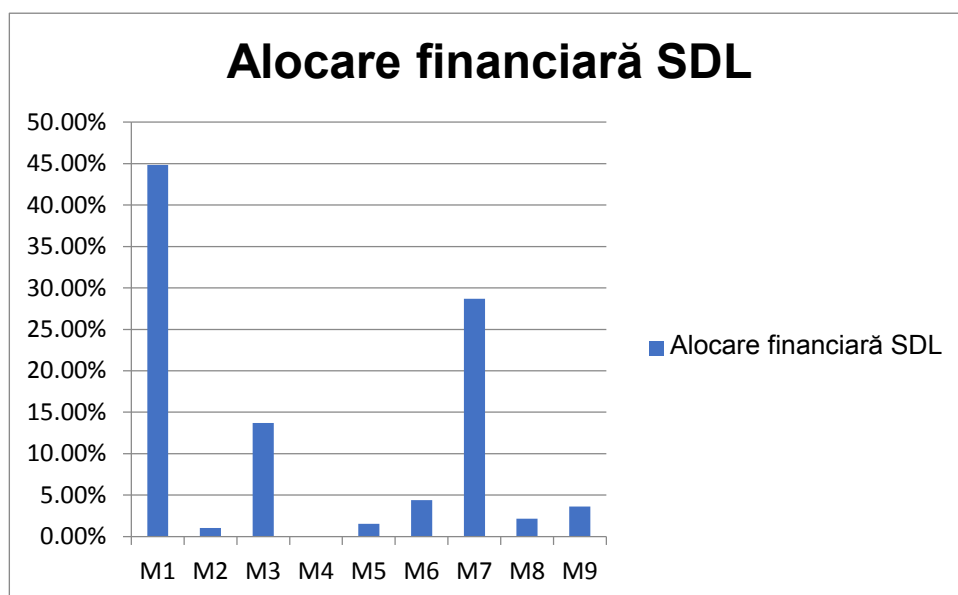

Alocarea financiară comparativă pe măsuri

4. CADRUL DE EVALUARE ȘI METODOLOGIA

Structura capitolului:

- 4.1. Prezentarea cadrului de evaluare
- 4.2. Metode și tehnici folosite – Aspecte generale

4.1. Prezentarea cadrului de evaluare

În procesul de evaluare a SDL am folosit atât teme de evaluare comune, cât și teme de evaluare specifice care au fost definite pornind de la obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală.

TEME DE EVALUARE:

- ☒ Tema de evaluare 1: LOGICA DE INTERVENȚIE A STRATEGIEI
- ☒ Tema de evaluare 2: CONTRIBUȚIA SDL LA ÎNTĂRIREA SECTORULUI AGRICOL
- ☒ Tema de evaluare 3: CONTRIBUȚIA SDL LA REDUCEREA DEPENDENȚEI POPULAȚIEI DE AGRICULTURĂ
- ☒ Tema de evaluare 4: CONTRIBUȚIA SDL LA DEZVOLTAREA UNEI INFRASTRUCTURI DE BAZĂ MODERNE
- ☒ Tema de evaluare 5: VALOAREA ADĂUGATĂ DATORATĂ METODEI LEADER




Figura 1 - Corelația dintre obiectivele din SDL și temele de evaluare

Respectând cerințele de la pagina 31 din Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, versiunea 17, prin care se precizează că „pentru fiecare obiectiv prevăzut în Strategia De Dezvoltare Locală (SDL) trebuie formulată o temă de evaluare, cu cel puțin o întrebare de evaluare și cu cel puțin un criteriu” prezentăm temele de evaluare corelate cu obiectivele din SDL.

Obiectivul din SDL	Tema de evaluare corespondentă obiectivului din SDL
Obiectivul 1: Întărirea sectorului agricol prin creșterea competitivității și eficienței exploatațiilor din interiorul GAL	Tema de evaluare 2: CONTRIBUȚIA SDL LA ÎNTĂRIREA SECTORULUI AGRICOL
Obiectivul 2: Reducerea dependenței populației de agricultură	Tema de evaluare 3: CONTRIBUȚIA SDL LA REDUCEREA DEPENDENȚEI POPULAȚIEI DE AGRICULTURĂ
Obiectivul 3: Creșterea bunăstării populației prin dezvoltarea unei infrastructuri de bază moderne	Tema de evaluare 4: CONTRIBUȚIA SDL LA DEZVOLTAREA UNEI INFRASTRUCTURI DE BAZĂ MODERNE

Mai departe, am dezvoltat fiecare temă de evaluare cu criteriile de evaluare, întrebările de evaluare, indicatorii și metodologia de evaluare.

TEMA DE EVALUARE (1): LOGICA DE INTERVENȚIE A STRATEGIEI			
Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel, s-au modificat Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a ține cont de dinamica acestor nevoi Sunt activitățile (măsurile, procedurile, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatorii)	În ce măsură logica de intervenție a SDL a fost relevantă în raport cu nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului și cât de coerentă este aceasta?	- Numărul de nevoi/măsurile din cadrul SDL revizuite - Numărul de măsuri eliminate din SDL - Numărul de măsuri noi adăugate în SDL - Nr. măsuri de sprijin cuprinse în SDL (inițial) - Gradul de acoperire a nevoilor identificate în teritoriu cu măsuri de finanțare, cuantificat pe o scară: <i>Mic Mare Complet</i>	Studiul/Analiza documentelor Au fost colectate și analizate informații relevante din surse scrise: - Documente GAL - Strategia de Dezvoltare a Asociației GAL Iași Sud-Vest Observația Au fost investigate fenomenele în cadrul lor natural de desfășurare; Sondajul de opinie Au fost culese informații relevante de la beneficiarii SDL

prevăzuți în strategie)?			
Sunt rezultatele așteptate clar definite?			

Cum va fi apreciat răspunsul la întrebarea de evaluare:

Răspunsul la întrebarea de evaluare privind logica de intervenție a SDL va fi însoțit de o apreciere a evaluatorului, pe o scală:

Puțin relevantă, Puțin coerentă	Relevantă, Coerentă	Foarte relevantă, Foarte coerentă
---------------------------------	---------------------	-----------------------------------

TEMA DE EVALUARE (2): CONTRIBUȚIA SDL LA ÎNTĂRIREA SECTORULUI AGRICOL			
Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Creșterea numărului de exploatații agricole sprijinite Creșterea competitivității firmelor din domeniul afacerilor agricole Creșterea dotărilor tehnice din domeniul agricol Sprijinirea tinerilor și a femeilor în domeniul sectorului agricol	În ce măsură intervenția SDL a contribuit la sprijinirea sectorului agricol și la creșterea competitivității firmelor din domeniul agricol?	- Nr. de exploatații agricole sprijinite - Locuri de muncă create - Procent plăți raportat la alocarea financiară - Procent alocare financiară din total SDL - A crescut gradul de mecanizare în sectorul agricol de pe teritoriul GAL? - Cel puțin un proiect este implementat de femei - Cel puțin 50 % din proiecte sunt implementate de tineri - A crescut productivitatea muncii ? - Reducerea costurilor de producție (Consumuri combustibil, piese de schimb etc)	Studiul/Analiza documentelor Au fost colectate și analizate informații relevante din surse scrise: - Documente GAL - Monitorizare GAL - Strategia de Dezvoltare a Asociației GAL Iași Sud-Vest Observația Au fost investigate fenomenele în cadrul lor natural de desfășurare; Sondajul de opinie Au fost colectate informații relevante de la beneficiarii SDL Studiul de caz Analiza detaliată a implementării unui proiect de către un beneficiar

Cum va fi apreciat răspunsul la întrebarea de evaluare:		
Măsura în care SDL a sprijinit sectorul agricol:		
În mică măsură	În măsură medie	În mare măsură

TEMA DE EVALUARE (3): CONTRIBUȚIA SDL LA REDUCEREA DEPENDENȚEI POPULAȚIEI DE AGRICULTURĂ			
Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Sprijinirea afacerilor non-agricole Creșterea competitivității firmelor din domeniul afacerilor non-agricole Sprijinirea tinerilor și a femeilor în domeniul afacerilor non-agricole	În ce măsură intervenția SDL a sprijinit afacerile non-agricole și creșterea competitivității firmelor din domeniul non-agricol?	- Nr. proiecte în domeniul afacerilor non-agricole - Locuri de muncă create în domenii non-agricole - Total plăți proiecte finalizate raportat la alocarea financiară - Procent proiecte finalizate dintre cele contractate - Cel puțin un proiect este implementat de femei - Cel puțin un proiect este implementat de tineri - A crescut productivitatea muncii?	Studiul/Analiza documentelor Au fost colectate și analizate informații relevante din surse scrise: - Documente GAL - Strategia de Dezvoltare a Asociației GAL Iași Sud-Vest Observația Au fost investigate fenomenele în cadrul lor natural de desfășurare; Sondajul de opinie Au fost colectate informații relevante de la beneficiarii SDL Studiul de caz Analiza detaliată a implementării unui proiect de către un beneficiar

Cum va fi apreciat răspunsul la întrebarea de evaluare:		
Măsura în care SDL a sprijinit afacerile non-agricole:		
În mică măsură	În măsură medie	În mare măsură

TEMA DE EVALUARE (4): CONTRIBUȚIA SDL LA DEZVOLTAREA UNEI INFRASTRUCTURI DE BAZĂ MODERNE			
Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date

Îmbunătățirea serviciilor și a infrastructurilor în zonele rurale Creșterea accesului la serviciile și la infrastructurile locale în zonele rurale.	În ce măsură a sprijinit intervenția SDL la dezvoltarea unei infrastructuri de bază moderne?	• Numărul de măsuri • Numărul de proiecte • Procentul populației • beneficiară de infrastructuri îmbunătățite • Nr UAT-uri care au implementat proiecte • Creșterea bunăstării populației	Studiul/Analiza documentelor Au fost colectate și analizate informații relevante din surse scrise: • Documente GAL • Strategia de Dezvoltare a Asociației GAL Iași Sud-Vest Observația Au fost investigate fenomenele în cadrul lor natural de desfășurare; Sondajul de opinie Au fost colectate informații relevante de la beneficiarii SDL Studiul de caz Analiza detaliată a implementării unui proiect de către un beneficiar
---	---	--	--

Cum va fi apreciat răspunsul la întrebarea de evaluare:

Răspunsul la întrebarea de evaluare privind sprijinirea dezvoltării locale în zonele rurale de către SDL va fi însoțit de o apreciere a evaluatorului, pe o scală:

În mică măsură	În măsură medie	În mare măsură
----------------	-----------------	----------------

Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Capitalul social Îmbunătățit Guvernanța locală • Îmbunătățirea capitalului social (învățarea colectivă, schimbarea mentalităților, creșterea colaborării și încrederii reciproce și față de GAL, identificarea unor subiecte de interes comun, dezvoltarea de competențe și capacități, dezvoltarea unor rețele etc.); • Îmbunătățirea Guvernanței locale la nivel local • Îmbunătățirea calității vieții în teritoriul Asociației GAL Iași Sud-Vest prin Rezultatele implementării SDL (crearea de locuri de muncă, infrastructură de bază, sprijinirea tinerilor, sprijinirea femeilor), prin aplicarea metodei LEADER.	Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER ?	• Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării metodei LEADER, cuantificată pe o scală: <i>Îmbunătățire mică</i> <i>Îmbunătățire medie</i> <i>Îmbunătățire mare</i> • În ce mod putem aprecia rezultatele SDL: <i>Puțin Bune, Bune, Foarte Bune</i> - În ce mod au fost influențate rezultatele înregistrate de implementarea SDL datorită aplicării metodei LEADER, pe o scală: <i>În mică măsură</i> <i>În măsură medie</i> <i>În mare măsură</i> - Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a guvernanței la nivel local datorită aplicării metodei LEADER, pe o scală: Nu am remarcat o îmbunătățire <i>Îmbunătățire medie</i> <i>Îmbunătățire mare</i> • Nr. locuri de muncă • Nr. de femei sprijinite pe total SDL • Nr. de tineri până în 40 de ani sprijiniți • Nr. de UAT-uri acoperite cu proiecte de infrastructură de bază	Studiul/Analiza documentelor Au fost colectate și analizate informații relevante din surse scrise: • Documente GAL • Strategia de Dezvoltare a Asociației GAL Iași Sud-Vest Observația Au fost investigate fenomenele în cadrul lor natural de desfășurare; Sondajul de opinie Au fost colectate informații relevante de la beneficiarii SDL

Responsabilul de evaluare împreună cu echipa de evaluare a definit criterii specifice pentru fiecare din întrebările de evaluare în parte. Aceste criterii permit stabilirea de corelații între întrebările de evaluare, indicatorii relaționați și sursele de informare disponibile.

La elaborarea criteriilor de evaluare s-a acordat o atenție specială relației lor logice cu obiectivele fiecărei măsuri evaluate.

Fiecare criteriu caută să evalueze aspecte concrete ale întrebării astfel încât, prin integrarea lor să se poată obține un răspuns complet și coerent la întrebările de evaluare. Definirea și înțelegerea criteriului propus permite stabilirea informației corecte. Această structurare a întrebărilor, criteriilor și indicatorilor se leagă de procesul participativ și de culegere și prelucrare a informațiilor, astfel încât întreaga informație disponibilă să se poată procesa pentru a îmbunătăți înțelegerea întrebării și precizia răspunsul la întrebările de evaluare. Procesul ulterior de observare permite validarea și actualizarea criteriilor de evaluare în funcție de noile surse de informații care apar pe parcurs.

4.2. Metode și tehnici - Aspecte generale

În procesul de evaluare a Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Iași Sud-Vest s-a utilizat un mix de metode și tehnici. S-a folosit cercetarea cantitativă și cercetarea calitativă aplicate surselor de date.

Alegerea metodelor și tehnicilor de evaluare utilizate în cadrul procesului de evaluare s-a făcut în funcție de specificul strategiei, obiectivele evaluării, contextul implementării strategiei, caracteristicile beneficiarilor intervențiilor.

Analiza s-a bazat, în limita posibilităților, pe **triangulația surselor de date** și a **metodelor și tehnicilor de evaluare utilizate**. Triangulația surselor de date a presupus obținerea de informații din 3 surse de date diferite; triangularea metodelor și tehnicilor de evaluare utilizate a presupus utilizarea unui mix de metode și tehnici, atât calitative, cât și cantitative.

Ancheta pe bază de sondaj utilizează ca instrument în cercetare chestionarul, cu adresabilitate beneficiarilor privați și beneficiarilor publici care au depus proiecte de finanțare la Asociația GAL Iași Sud-Vest. S-a ales această metodă deoarece permite un control mai bun asupra condițiilor de desfășurare a cercetării precum și o bună analiză din punct de vedere statistic.

Chestionarul cuprinde atât întrebări închise, cât și întrebări deschise. Întrebările deschise dau posibilitatea respondenților de a-și exprima gândurile, opiniile, așteptările în mod liber, așa cum percep ei aspectele avute în vedere.

În proiectarea anchetei pe bază de chestionar s-au parcurs următoarele etape:

1. Stabilirea și delimitarea temei de cercetat
2. Formularea obiectivelor
3. Calcularea și stabilirea mijloacelor materiale (buget, timp)
4. Documentarea (teoretică și pe baza studiilor anterioare realizate pe aceeași temă)
5. Determinarea eșantionului cercetării
6. Redactarea proiectului de chestionar
7. Ajustarea chestionarului
8. Aplicarea chestionarului
9. Preluarea și interpretarea datelor
10. Redactarea concluziilor rezultate în urma cercetării.

Cercetarea de teren s-a desfășurat la nivelul teritoriului Asociației GAL Iași Sud-Vest.

Au fost aplicate două chestionare în rândul beneficiarilor Asociației GAL Iași Sud-Vest:

- **Chestionar pentru beneficiarii publici.** Mărimea eșantionului din rândul beneficiarilor publici a fost de 14 subiecți.
- **Chestionar pentru beneficiarii privați** (Anexa 2 la Raportul de evaluare - macheta chestionarului pentru beneficiarii privați). Mărimea eșantionului din rândul beneficiarilor privați a fost de 15 subiecți.

Cele două chestionare conțin atât întrebări comune, cât și întrebări specifice celor două tipuri de beneficiari și acoperă mai multe teme / întrebări de evaluare. Acestea au fost aplicate folosindu-se mijloacele electronice de comunicare fiind susținute și de contactarea telefonică.

Eșantionul a fost ales din grupul țintă vizat, cel al beneficiarilor de proiecte la Asociația GAL Iași Sud-Vest, pe criterii de reprezentativitate.

Prelucrarea datelor preluate prin chestionare s-a făcut separat, pe beneficiari publici și beneficiari privați și unde a fost cazul, pe măsurile de finanțare la care au aplicat beneficiarii. De asemenea, unele întrebări comune celor două tipuri de beneficiari au fost prelucrate și interpretate folosindu-se comasarea și totalizarea răspunsurilor, în funcție de scopul urmărit prin analiza statistică.

Studiul de caz reprezintă analiza detaliată a unei situații, în cazul nostru, implementarea unui proiect de către un beneficiar pe Măsura 1 (agricol) și implementarea unui proiect de către un beneficiar pe Măsura 3 (non agricol).

Selecția subiecților s-a făcut după gradul de relevanță pentru tema studiată.

Studiul/Analiza documentelor

S-au avut în vedere Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Iași Sud-Vest, rapoarte, articole publicate de GAL Iași Sud-Vest pe site-ul web și în presă, documentarea de teren, prin luarea la cunoștință pe cale directă de fenomenele ce alcătuiesc tema cercetării.

Analiza documentară a vizat următoarele elemente:

- ✓ Strategia de Dezvoltare Locală (inițială și versiunile modificate)
- ✓ Rapoartele finale de selecție a proiectelor
- ✓ Rapoarte suplimentare de selecție a proiectelor
- ✓ Rapoarte de contestații
- ✓ Comunicate de presă
- ✓ Proiecte de finanțare depuse la GAL
- ✓ Alte documente informative
- ✓ Monitorizarea efectuată de GAL

O categorie aparte de informații foarte importante pentru evaluare, în special pentru evaluarea rezultatelor abordării LEADER, provine din monitorizarea propriei activități a Asociației GAL Iași Sud-Vest, în special privind interacțiunea acestuia cu actorii locali (acțiunile de animare).

O mare parte a unor astfel de informații este colectată de către Asociația GAL Iași Sud-Vest în scopul raportării costurilor de funcționare și de animare și în alte scopuri de evidență

Grup țintă de la care se colectează informații :

- Beneficiari direcți și indirecti ai proiectelor
- Parteneri GAL
- Reprezentanți ai sectorului privat
- Populația din teritoriul GAL
- Furnizori de date statistice

Descrierea principalelor limitări și constrângeri întâmpinate

În procesul de evaluare apar limitări aferente fiecărei etape. Acestea pot fi:

- Limitările externe sunt acele limitări care se datorează unor factori care scapă controlului procesului de evaluare.
- Limitările interne sunt limitările proprii procesului de evaluare și instrumentelor de evaluare selectate pentru a răspunde la întrebările de evaluare. Identificarea acestora ajută la prevenirea devierilor în ceea ce privește formularea rezultatelor de evaluare.

Principalele limitări și constrângeri derivă din însăși limitările și constrângerile metodelor și tehnicilor de evaluare utilizate.

5. ANALIZA DE ANSAMBLU A EFICACITĂȚII SDL

Structura capitolului

- 5.1 Eficacitatea financiară a măsurilor la nivel de SDL
- 5.2 Eficacitatea SDL, la nivel de domeniu de intervenție

5.1 Eficacitatea financiară a măsurilor la nivel de SDL

În Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Iași Sud-Vest au existat inițial 9 măsuri de finanțare. Începând cu versiunea a 11-a a SDL, Măsura 4 – „Sprijin pentru activități turistice și recreative” a fost desființată din cauza interesului scăzut al beneficiarilor.

- M1/DI 2.1. „Sprijin pentru exploatații agricole”
- M2/DI 2.2. „Sprijin pentru constituirea și promovarea formelor asociative”
- M3/DI 3.1. „Sprijin pentru afaceri non-agricole”
- M4/DI 3.1. „Sprijin pentru activități turistice și recreative”
- M5/DI 1.1. „Sprijin pentru punerea în valoare a patrimoniului local, meșteșugurilor și obiceiurilor locale”
- M6/DI 1.1. „Sprijin pentru acțiuni de mediu”
- M7/DI 1.2. „Sprijin pentru înființarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii”
- M8/DI 1.3. „Sprijin pentru investiții în infrastructura socială”
- M9/ DI 1.3. „Sprijin pentru integrarea minorităților locale”

Tabel 4 Situația implementării SDL la zi, în raport cu alocarea inițială

CODIFICAREA MĂSURII	Alocarea totală/măsură (Buget alocat inițial)	Alocarea totală/măsură (ultima versiune SDL – Buget la momentul evaluării)	Nr. proiecte SELECTATE la nivel de GAL	Valoarea publică a proiectelor selectate	Nr. proiecte contractate	Valoarea publică a proiectelor contractate	Nr. contracte reziliate	Valoarea contractelor reziliate	Total sumă plătită
M1/DI 2.1	599.649,72	1.154.643,02	12	1.260.972,00	11	1.160.325,50	0	0,00	1.152.643,89
M2/DI 2.2	30.000,00	27.125,00	2	57.125,00	1	27.125,00	0	0,00	27.125,00
M3/DI 3.1 (FEADR+EURI)	200.000,00	352.788,25	6	354.758,70	6	354.758,70	0	0,00	352.129,57
M4/DI 3.1	123.479,34	0,00	3	109.953,00	2	94.959,00	2	94.959,00	0,00
M5/DI 1.1	30.000,00	39.300,55	4	51.030,60	3	39.357,60	0	0,00	38.926,74
M6/ DI1.1	90.000,00	113.517,66	2	118.652,10	2	118.428,00	0	0,00	108.554,28

M7/ DI 1.2	648.245,06	738.220,60	14	762.944,00	14	753.498,00	0	0,00	730.187,90
M8/ DI 1.3	60.000,00	56.142,12	1	59.997,00	1	59.997,00	0	0,00	56.142,12
M9/ DI 1.3	100.000,00	93.161,38	1	100.000,00	1	100.000,00	0	0,00	93.161,38
TOTAL FEADR+EURI	1.881.374,12	2.574.898,58	45	2.875.432,40	41	2.708.448,80	2	94.959,00	2.558.870,88

Eficacitatea financiară a măsurilor la nivel de SDL

Tabel 5 Eficacitatea financiară a măsurilor la nivel de SDL

Măsurile SDL	Buget alocat inițial	Buget alocat la momentul evaluării	Plăți efectuate raportat la bugetul inițial	Eficacitate financiară
M1/DI 2.1	599.649,72	1.154.643,02	192,22%	ridicată
M2/DI 2.2	30.000,00	27.125,00	90,42%	ridicată
M3/DI 3.1	200.000,00	352.788,25	176,06%	ridicată
M4/DI 3.1	123.479,34	0,00	0,00%	redușă
M5/DI 1.1	30.000,00	39.300,55	129,76%	ridicată
M6/ DI1.1	90.000,00	113.517,66	120,62%	ridicată
M7/ DI 1.2	648.245,06	738.220,60	112,64%	ridicată
M8/ DI 1.3	60.000,00	56.142,12	93,57%	ridicată
M9/ DI 1.3	100.000,00	93.161,38	93,16%	ridicată
Total 19.2	1.881.374,12	2.574.898,58	136,01%	ridicată

8 din 9 măsuri au o eficacitate financiară ridicată cu un procent ce se apropie de 100% sau chiar depășește 100%. O măsură are un procent de eficacitate financiară redus.

Pe total SDL eficacitatea financiară este ridicată.

Concluzia și răspunsul final privind eficacitatea măsurilor SDL

Având în vedere că plățile efectuate raportate la ultima versiune de SDL reprezintă un procent de 99,38%, plățile efectuate raportate la versiunea inițială de SDL reprezintă un procent de 136,01%, iar valoarea contractată este de 105,19% (deci chiar mai mare decât alocarea financiară) considerăm că **EFICACITATEA MĂSURILOR DIN SDL este RIDICATĂ**

5.2. Eficacitatea SDL, la nivel de domeniu de intervenție

Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Iași Sud-Vest acoperă 6 domenii de intervenție. Începând cu versiunea a 11-a a SDL, Măsura 4 – „Sprijin pentru activități turistice și recreative” a fost desființată din cauza interesului scăzut al beneficiarilor

Tabel 6 Eficacitatea financiară la nivel de domeniu de intervenție

Domeniul de intervenție	Eficacitate
<i>D.I.2.1. Restructurarea și modernizarea sectorului agricol</i>	ridică
<i>D.I. 2.2. Încurajarea asocierii și schimbului de experiență între fermieri</i>	ridică
<i>D.I.3.1. Diversificarea activităților economice</i>	ridică
<i>D.I.1.1. Refacerea, conservarea și dezvoltarea patrimoniului local și de mediu</i>	ridică
<i>D.I. 1.2. Dezvoltarea infrastructurii locale</i>	ridică
<i>D.I. 1.3. Încurajarea activităților pentru incluziunea socială a grupurilor defavorizate</i>	ridică

Detalierea și calcul procent pentru interpretare eficacitate pe domenii de intervenție

Tabel 7 Calcul eficacitate financiară pe domeniu de intervenție

Domeniul de intervenție	Buget inițial reieșit din măsurile componente (euro)	Plăți efectuate pe măsurile componente (euro)	Plăți efectuate raportate la bugetul inițial	Eficacitate Domeniu de intervenție
D.I.2.1. Restructurarea și modernizarea sectorului agricol	599.649,72	1.152.643,89	192,22%	Ridică
D.I. 2.2. Încurajarea asocierii și schimbului de experiență între fermieri	30.000,00	27.125,00	90,42%	ridică
D.I.3.1. Diversificarea activităților economice	323.479,34	352.129,57	108,86%	ridică
D.I.1.1. Refacerea, conservarea și dezvoltarea patrimoniului local și de mediu	120.000,00	147.481,02	122,90%	ridică
D.I. 1.2. Dezvoltarea infrastructurii locale	648.245,06	730.187,90	112,64%	ridică

Matricea privind indicatorii de rezultat realizați

Tabel 8 Matricea privind indicatorii de rezultat realizați

Obiectiv din SDL	Intrări (suma și destinația) Măsuri (ultima versiune SDL)	Indicatori de rezultat				Domeniul de intervenție	Indicatori de rezultat	
		Indicator	Planificat în SDL	Realizat	Procent Realizat		Indicator	Realizat
Întărirea sectorului agricol prin creșterea competitivității și eficienței exploatațiilor agricole	1.154.643,02 M1 Sprijin pentru exploatații agricole	Locuri de muncă create	3	16	533,33%	D.I.2.1. Restructurarea și modernizarea sectorului agricol	Locuri de muncă create	16
		Exploatații agricole sprijinite	3	11	367%		Exploatații agricole sprijinite	11
		Total investiții (euro)	417.693,00	1.152.643,89	276%		Total investiții (euro)	1.152.643,89
	27.125,00 M2 Sprijin pentru constituirea și promovarea formelor asociative	Locuri de muncă create	1	0	0%	D.I. 2.2. Încurajarea asocierii și schimbului de experiență între fermieri	Locuri de muncă create	0
		Forme asociative sprijinite	1	1	100%		Forme asociative sprijinite	1
		Nr. fermieri sprijiniți	5	11	220%		Nr. fermieri sprijiniți	11
		Total investiții (euro)	30.000,00	27.125,00	90%		Total investiții (euro)	27.125,00
Reducerea dependenței populației de agricultură	352.788,25 M3 Sprijin pentru afaceri non agricole	Locuri de muncă create	1	9	900%	D.I.3.1. Diversificarea activităților economice	Locuri de muncă create	9
		Număr de proiecte realizate	2	6	300%			
		Total investiții (euro)	150.000,00	352.129,57	235%			
	0 M4 Sprijin pentru activități turistice și recreative	Locuri de muncă create	1	0	0%		Număr de proiecte realizate	6
		Număr de proiecte realizate	1	0	0%		Total investiții (euro)	0,00
		Total investiții (euro)	80.000,00	0	0%			
Creșterea bunăstării populației prin dezvoltarea unei infrastructuri de bază moderne	39.300,55 M5 Sprijin pentru punerea în valoare a patrimoniului local, meșteșugurilor și obiceiurilor locale	Locuri de muncă create	nu e prevăzut	0	nu e cazul	D.I.1.1. Refacerea, conservarea și dezvoltarea patrimoniului local și de mediu	Locuri de muncă create	1
		Număr de proiecte realizate	1	3	300%			
		Total investiții (euro)	30.000,00	38.926,74	130%		Număr de proiecte realizate	4
	113.517,66 M6 Sprijin pentru acțiuni de mediu	Locuri de muncă create	1	1	100%		Total investiții (euro)	147.481,02
		Număr de proiecte realizate	2	2	100%	D.I. 1.2. Dezvoltarea	Locuri de muncă create	
		Total investiții (euro)	70.000,00	108.554,28	155%			
	738.220,60 M7	Locuri de muncă create	7	8	114%			

„Sprijin pentru înființarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii”	Număr de proiecte realizate	7	14	200%	infrastructurii locale	Număr de proiecte realizate	
	Total investiții (euro)	400.000,00	730.187,90	183%		Total investiții (euro)	
	Populație beneficiară	nu e prevăzut	toată populația rurală a GAL	nu e cazul		Populație beneficiară	toată populația rurală a GAL
56.142,12 M8 „Sprijin pentru investiții în infrastructura socială”	Locuri de muncă create	nu e prevăzut	0	nu e cazul	DI 1.3. - Încurajarea activităților pentru incluziune socială a grupurilor defavorizate și reducerea sărăciei	Locuri de muncă create	1
	Număr de proiecte realizate	1	1	1		Număr de proiecte realizate	2
	Total investiții (euro)	60.000,00	56.142,12	94%		Total investiții (euro)	149.303,50
	Locuitori beneficiari	nu e prevăzut	30 copii	nu e cazul		Locuitori beneficiari	550
93.161,38 M9 „Sprijin pentru integrarea minorităților locale”	Locuri de muncă create	nu e prevăzut	1	nu e cazul			
	Număr de proiecte realizate	1	1	100%			
	Locuitori beneficiari	100	520	520%			
	Total investiții (euro)	100.000,00	93.161,38	93%			

Majoritatea indicatorilor de rezultat sunt depășiți cu mult peste valoarea indicatorilor planificați în SDL. Doar la Măsura 4 indicatorii de rezultat nu au putut fi realizați deoarece aceasta a fost desființată din cauza interesului scăzut din partea beneficiarilor. Cu toate că aceasta a fost desființată, pe total intervenție (D.I. 3.1) indicatorii au fost depășiți. Unii indicatori se apropie de valoarea de 100%. Considerăm că aceștia au fost îndepliniți. În cazul Măsurii 2, indicatorul locuri de muncă nu a fost îndeplinit, dar pe total strategie, acesta a fost cu mult depășit decât cel planificat (realizare 417,67% locuri de muncă în domeniul privat față de valoarea planificată).


Concluzia și răspunsul final privind eficacitatea SDL la nivel de domeniu de intervenție

Având în vedere că eficacitatea pe fiecare domeniu de intervenție este ridicată iar considerăm că **EFICACITATEA SDL LA NIVEL DE DOMENIU DE INTERVENȚIE ESTE RIDICATĂ**

5.3. Analiza indicatorilor de monitorizare

Analiza gradului de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală

- Gradul de selecție a proiectelor (Grad de absorbție fonduri)
- Gradul de contractare a proiectelor selectate
- Gradul de finalizare a proiectelor
- Procent plăți raportat la total alocare

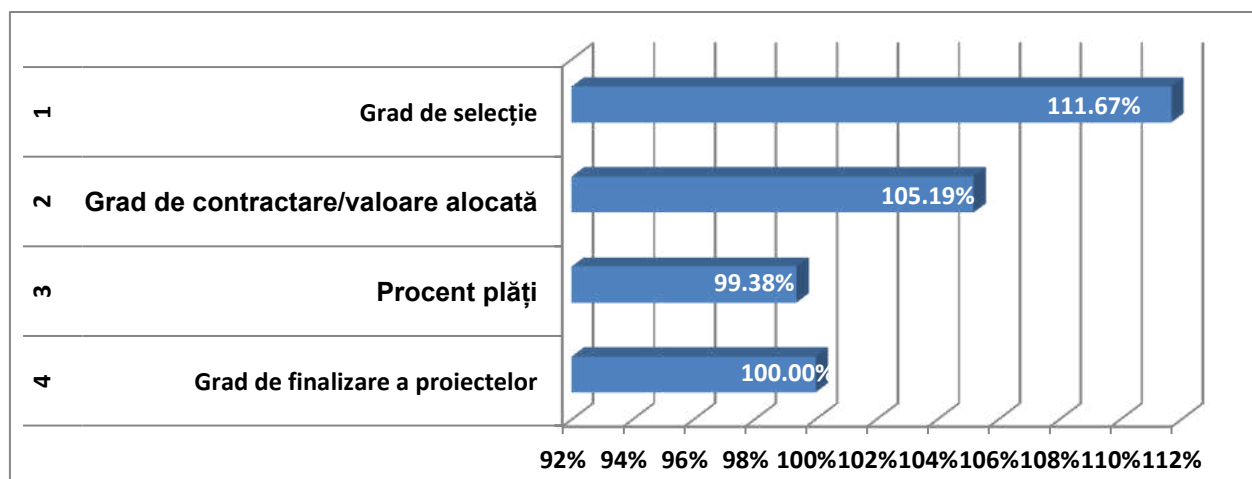

Gradul de selecție a fondurilor alocate:

Gradul de selecție a proiectelor (G_s) se calculează ca raport procentual între valoarea publică aferentă proiectelor selectate de GAL (V_p) și valoarea totală a fondurilor alocate GAL (V_t).

$$G_s = \frac{V_p}{V_t} \times 100 = \frac{2.875.432,40}{2.574.898,58} \times 100 = \mathbf{111,67\%}$$

Rata de eșec:

Rata de eșec (Re) se calculează ca raport procentual între numărul de proiecte declarate neeligibile de OFIR/CRFIR ($Nr.ne$) și numărul de proiecte depuse de GAL la OJFIR/CRFIR ($Nr.d$).

$$Re = \frac{Nr.ne}{Nr.d} \times 100 = \frac{0}{45} \times 100 = \mathbf{0\%}$$

Gradul de contractare a proiectelor selectate (raportat la alocare financiară):

$$Gc = \frac{Vc}{Ac} \times 100 = \frac{2.588.870,88}{2.574.898,58} \times 100 = \mathbf{105,19\%}$$

Gradul de contractare a proiectelor în funcție de valoarea proiectelor (Gc) se calculează ca raport procentual între valoarea proiectelor contractate (Vc) și alocare financiară (Af).

Gradul de finalizare a proiectelor

Gradul de finalizare a proiectelor (Gf) se calculează ca raport procentual între nr proiectelor finalizate (Nf) și numărul proiectelor contractate (Nc) – numărul proiectelor reziliate (Nrez)

$$Gf = \frac{Nf}{Nc} \times 100 = \frac{39}{41 - 2} \times 100 = \mathbf{100\%}$$

Procent plăților raportat la ultima versiune de SDL:

Procentul plăților se calculează ca raport procentual între valoare plăților și valoarea alocării financiare.

$$P = \frac{Vp}{Vc} \times 100 = \frac{2.558.870,88}{2.574.898,58} \times 100 = \mathbf{99,38\%}$$

6. RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRILE DE EVALUARE

TEMA DE EVALUARE (1): LOGICA DE INTERVENȚIE A STRATEGIEI

Întrebarea de evaluare:

- 1. În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală a fost relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului și cât de coerentă este acesta?**

Nevoi ce au trebuit să fie acoperite prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală

La nivelul teritoriului GAL Iași Sud-Vest, după interpretarea analizei SWOT, rezultatul a fost sintetizat printr-o serie de nevoi ce trebuie acoperite:

- Creșterea productivității terenurilor printr-o utilizare mai judicioasă a acestora și prin implementarea de tehnologii de lucru eficiente.
- Creșterea vizibilității produselor agricole din GAL
- Reducerea poluării solului prin utilizarea judicioasă a îngrășămintelor
- Oprirea fărâmițării terenurilor agricole
- Crearea de locuri de muncă, în special în activități agricole și non agricole
- Stimularea și sprijinirea inițiativelor private în toate domeniile de activitate (
- Înființarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii de bază ca motor al eliminării decalajului rural/urban
- Protejarea mediului înconjurător și acțiuni de combatere a secetei
- Combaterea sărăciei și creșterea incluziunii sociale a categoriilor defavorizate
- Întărirea identității naționale prin conservarea și promovarea tradițiilor, inclusiv a etnicilor
- Protejarea, conservarea și punerea în valoare a patrimoniului de mediu, cultural și turistic

Pornind de la nevoile identificate, s-au definit obiectivele de atins de către SDL

Obiectiv general		Obiective specifice	Rezultate planificate
O1	Întărirea sectorului agricol prin creșterea competitivității și eficienței exploatațiilor agricole	Restructurarea și modernizarea sectorului agricol	✓ Creșterea productivității terenurilor printr-o utilizare judicioasă a acestora ✓ Creșterea productivității terenurilor prin implementarea de tehnologii de lucru eficiente ✓ Reducerea poluării solului prin utilizarea judicioasă a îngrășămintelor ✓ Oprirea fărâmițării terenurilor agricole ✓ Crearea de locuri de muncă în activități agricole
		Încurajarea asocierii și schimbului de experiență între fermieri	✓ Creșterea vizibilității produselor agricole din GAL ✓ Stimularea și sprijinirea inițiativelor private în toate domeniile de activitate
O2	Reducerea dependenței populației de agricultură	Diversificarea activităților economice	✓ Dezvoltarea afacerilor non agricole ✓ Crearea de locuri de muncă în activități non agricole ✓ Combaterea sărăciei ✓ Stimularea și sprijinirea inițiativelor private în toate domeniile de activitate
O3	Creșterea bunăstării populației prin dezvoltarea unei infrastructuri de bază moderne	Refacerea, conservarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și de mediu	✓ Protejarea mediului înconjurător și acțiuni de combatere a secetei ✓ Întărirea identității naționale prin conservarea și promovarea tradițiilor, inclusiv a etnicilor ✓ Protejarea, conservarea și punerea în valoare a patrimoniului de mediu, cultural și turistic
		Dezvoltarea infrastructurii locale	✓ Crearea de locuri de muncă ✓ Înființarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii de bază ca motor al eliminării decalajului rural/urban

		Încurajarea activităților pentru incluziune socială a grupurilor defavorizate și reducerea sărăciei	✓ Combaterea sărăciei și creșterea incluziunii sociale a categoriilor defavorizate
--	--	---	--

Față de momentul elaborării SDL nevoile identificate prin analiza SWOT nevoile s-au modificat puțin în sensul că măsura 4 privind activitățile turistice și recreative nu a mai prezentat interes.

Acest lucru înseamnă că la momentul elaborării SDL dar și anterior elaborării SDL s-a făcut o analiză de calitate în teritoriu prin întâlniri cu potențialii beneficiari și cu persoanele interesate.

Asociația GAL Iași Sud-Vest a avut în perioada analizată în total 13 modificări ale Strategiei de Dezvoltare Locală

- a) Modificările complexe au vizat îndreptarea unor erori materiale.
- b) Modificările simple au vizat realocarea sumelor ramase neutilizate pe măsuri închise către măsuri existente în SDL sau au vizat suplimentarea alocării financiare datorită bonusării, bonusării suplimentare sau fondurilor din FEADR Tranziție și EURI.
- c) Nu s-au introdus măsuri noi în SDL
- d) A fost eliminată Măsura 4 din SDL din cauza interesului scăzut în timp din partea beneficiarilor, dar pe același domeniu de intervenție (Măsura 3) a fost suplimentată alocarea financiară datorită interesului crescut.

În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală a fost relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului și cât de coerentă este aceasta?

- ✓ Numărul de nevoi/măsuri din cadrul SDL revizuite: 0
- ✓ Numărul de măsuri eliminate din SDL: 1
- ✓ Numărul de măsuri noi adăugate în SDL: 0
- ✓ Numărul de măsuri de sprijin cuprinse în SDL (inițial): 9
- ✓ Gradul de acoperire a nevoilor identificate cu măsuri de sprijin: **complet (100%)**

Concluzia și răspunsul final la întrebarea de evaluare:

În urma analizei efectuate considerăm că logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului a fost **foarte relevantă și foarte coerentă.**

TEMA DE EVALUARE (2): CONTRIBUȚIA SDL LA ÎNTĂRIREA SECTORULUI AGRICOL

Întrebarea de evaluare:

În ce măsură intervenția SDL a contribuit la sprijinirea sectorului agricol și la creșterea competitivității firmelor din domeniul agricol?

Așa cum reiese din analiza SWOT teritoriul Asociației GAL Iași Sud-Vest este unul eminamente agricol (76,70% din total suprafață agricolă, din care 93,11% terenuri agricole)..

Pentru a răspunde nevoilor identificate, în SDL s-au stabilit două măsuri incluse în două domenii de intervenții:

D.I.2.1. Restructurarea și modernizarea sectorului agricol

- Măsura 1 – „Sprijin pentru exploatații agricole”

D.I. 2.2. Încurajarea asocierii și schimbului de experiență între fermieri

- Măsura 2 – „Sprijin pentru constituirea și promovarea formelor asociative”

Măsura 1 – „Sprijin pentru exploatații agricole”

Scurtă descriere a măsurii:

Sectorul agricol la nivelul GAL este caracterizat de:

- *Slaba mecanizare a exploatațiilor agricole.*
- *Inexistența cadastrului pentru majoritatea terenurilor.*
- *Numărul scăzut de unități de depozitare și procesare a produselor agricole.*
- *Dependența de furnizorii de input-uri*

Măsura contribuie la obiectivul de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr 1305/2013 art. 4, alin. a): „Favorizarea competitivității agriculturii”

Valoarea adăugată a măsurii rezidă în:

- sprijinirea înființării și modernizării exploatațiilor agricole
- achiziția de utilaje noi și moderne ce va avea un impact pozitiv asupra mediului, prin reducerea consumurilor de carburanți și creșterea productivității muncii
- criterii de selecție specifice

Din criteriile de selecție specifice reiese că măsura și-a propus să sprijine într-o mai mare măsură:

- proiectele implementate de femei
- proiectele care generează locuri de muncă
- proiectele implementate de tineri până în 40 de ani

- responsabilizarea beneficiarului printr-un aport al contribuției proprii cât mai mare.

Date importante privind Măsura 1, în detaliu, în funcție de versiunea SDL

Alocare financiară pe Măsura 1	Situație proiecte pe Măsura 1
Alocare financiară inițială 599.649,72 euro	1 sesiune depunere proiecte în perioada 30.06-14.08.2017 8 proiecte depuse, din care: 5 selectate cu finanțare 2 fără finanțare (din cauza depășirii alocării financiare) 1 neeligibil Valoare totală proiecte depuse: 753.384,5 euro Valoare totală proiecte selectate: 524.157,5 euro Au rămas disponibile sume după selecție, dar fără să poată acoperi valoarea unui proiect dintre proiectele fără finanțare. În timpul procesului de evaluare și selecție de la AFIR un beneficiar și-a retras proiectul. <i>Caracteristici:</i> Măsura a fost supralicitată
Alocare financiară pe măsură în SDL versiunea 3: 652.739,50 euro Realocare sume între măsuri: <i>pentru a putea finanța cele două proiecte rămase fără finanțare s-au realocat sume rămase disponibile după închiderea măsurilor, în urma selecției de proiecte.</i> <i>Realocarea s-a realizat de la măsurile M7, M8, M3</i>	Raport de selecție suplimentar din data de 21.02.2018 Au fost selectate pe Raport de selecție suplimentar cele două proiecte care inițial au fost selectate fără finanțare Valoare ajutorului public nerambursabil a celor două proiecte este de 229.227,00 euro
Alocare financiară pe măsură în SDL versiunea 5: 722.710,10 euro <i>s-au realocat sume rămase disponibile după închiderea măsurilor, în urma selecției de proiecte, pentru a putea lansa un nou apel și o nouă sesiune de depunere proiecte</i> <i>Realocarea s-a realizat de la măsurile</i>	1 sesiune depunere proiecte în perioada 10.06 - 19.06.2019 A fost depus la GAL și selectat cu finanțare 1 proiect în valoare de 75.655,50 euro Proiectul a fost contractat și finalizat

M3, M4, M6	
Alocare financiară pe măsură în SDL versiunea 7: <i>În urma bonusării, s-a suplimentat alocarea financiară pe măsura 1 cu 151.595,82 euro.</i>	1 sesiune depunere proiecte în perioada 20.05-18.06.2020 Au fost depuse la GAL 2 proiecte, din care: 1 selectat cu finanțare 1 selectat fără finanțare (din cauza depășirii alocării financiare) Valoarea totală a proiectelor depuse este de 300.000 euro Valoarea proiectului selectat cu finanțare este de 150.000 Proiectul fără finanțare a fost retras. Proiectul selectat cu finanțare a fost contractat și finalizat <i>Caracteristici:</i> Măsura a fost supralicitată
Alocare financiară pe măsură în SDL versiunea 10: <i>În urma bonusării suplimentare, a crescut alocarea financiară pe măsura 1 cu 116.772,19 euro.</i>	1 sesiune depunere proiecte în perioada 20.08-30.08.2021 A fost depus la GAL și selectat cu finanțare 1 proiect în valoare de 116.772,00 euro Proiectul a fost contractat și finalizat
Alocare financiară pe măsură în SDL versiunea 12: <i>În urma primirii fondurilor din FEADR Tranziție, s-a suplimentat alocarea financiară pe măsura 1 cu 165.160,73 euro. euro.</i>	1 sesiune depunere proiecte în perioada 20.08-30.08.2021 Au fost depuse la GAL și selectate cu finanțare 2 proiecte în valoare de 165.160,00 euro. Proiectele au fost contractate și finalizate

În sinteză, pe Măsura 1 prezentăm următoarele date:

12 proiecte SELECTATE la nivel de GAL
1.260.972,00 euro valoarea publică a proiectelor selectate

11 proiecte contractate
1.160.325,50 euro valoarea proiectelor contractate

0 proiecte reziliate
1 proiect retras de la AFIR în timpul procesului de evaluare

11 proiecte finalizate
1.152.643,89 euro Total sumă plătită

- ✓ **11 exploatații agricole sprijinite**
- ✓ **3 din 11 proiecte sunt implementate de femei**
- ✓ **9 din 11 proiecte sunt implementate de tineri sub 40 de ani (81,82%)**

Indicatorii pe Măsura 1 au fost depășiți față de cei asumați în SDL:

Denumire indicator	Indicator planificat în SDL	Indicator realizat	Grad de realizare
Realizarea de locuri de muncă	3	16	533,33%
Exploatații agricole sprijinite	3	11	367,00%
Total investiții (euro)	417.693,00	1.152.643,89	276,00%

Măsura a fost supralicitată de două ori în două sesiuni diferite. În toată perioada de implementare a SDL au existat solicitări din teritoriu pentru accesarea de fonduri prin intermediul Măsurii 1 și pentru suplimentarea fondurilor pe Măsura 1.

În condițiile creșterii competitivității pe piața agricolă, investiția în tehnologie reprezintă o condiție esențială pentru optimizarea activității producătorilor.

Beneficiarii Măsurii 1, prin implementarea proiectelor, au realizat achiziții de utilaje agricole:

- ✓ Combine agricole
- ✓ Header combină păioase, header porumb și cărucioare header
- ✓ Tractoare, tractoare cu încărcător
- ✓ Mașini de ierbicidat
- ✓ Remorci și remorci basculante
- ✓ Pluguri, prășitori, combinatoare și semănători de precizie
- ✓ Distribuitoare de îngrășăminte
- ✓ Discuri, grapă, sprayer

Prin completarea și modernizarea resurselor tehnice s-au îmbunătățit condițiile de lucru, a crescut competitivitatea sectorului și s-au folosit tehnologii prietenoase cu mediul.

Prin achizițiile realizate, solicitanții au venit în întâmpinarea obiectivelor și acțiunilor eligibile din SDL contribuind la îndeplinirea acestora și aducând un aport important de ordin economic și social.

Bunurile achiziționate sunt de ultimă generație / tehnologie, au emisii minime de noxe și un consum scăzut și eficient de carburanți, contribuind astfel la diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

În concluzie putem aprecia că impactul măsurii a generat următoarele rezultate: a crescut gradul de mecanizare în sectorul agricol de pe teritoriul GAL Iași Sud-Vest, firmele din domeniul agricol sunt mai cunoscute, a crescut productivitatea muncii, au fost reduse pierderile

datorită realizării lucrărilor la timp, au fost reduse costurile de producție (consumuri, combustibili, piese de schimb etc.), a crescut calitatea produselor.

A doua măsură din SDL care răspunde temei de evaluare – Contribuția SDL la întărirea sectorului agricol este:

Măsura 2 – „Sprijin pentru constituirea și promovarea formelor asociative”

Având în vedere că sectorul agricol la nivelul GAL este caracterizat de:

- Reticența populației de a se organiza ca persoane juridice și de a se asocia.
- Fărâmițarea excesivă a terenului.
- Inexistența piețelor locale de desfacere a produselor agricole.
- Costuri mari ale inputurilor pentru exploatațiile mici.
- Lipsa posibilităților de informare și a consultanței de specialitate.
- Numărul scăzut de unități de depozitare și procesare a produselor agricole.

Valoarea adăugată a măsurii rezidă în:

- capacitatea de desfacere în comun a produselor
- creșterea eficienței exploatațiilor prin realizarea de activități în comun
- crearea unui cadru propice transferului de informație relevantă pentru fermieri
- realizarea de proiecte de investiții în comun
- criterii de selecție specifice

Date importante privind Măsura 2, în detaliu, în funcție de versiunea SDL

Alocare financiară pe Măsura 2	Situație proiecte pe Măsura 2
Alocare financiară inițială 30.000 euro	1 sesiune depunere proiecte în perioada 05.10. – 13.11.2017 cu o alocare financiară de 30.000 euro A fost depus la GAL și selectat cu finanțare 1 proiect în valoare de 30.000,00 euro Proiectul a fost retras de la AFIR în faza de evaluare.
Alocare financiară pe măsură în SDL versiunea 3: 30.000,00 euro	1 sesiune depunere proiecte în perioada 06.03.2018 - 19.04.2018 cu o alocare financiară de 30.000,00 euro A fost depus la GAL și selectat cu finanțare 1 proiect în valoare de 27.125,00 euro Proiectul a fost contractat și finalizat.

În sinteză, pe Măsura 2 prezentăm următoarele date:

2 proiecte SELECTATE la nivel de GAL
57.125,00 euro valoarea publică a proiectelor selectate

1 proiect contractat
27.125,00 euro valoarea proiectului contractat

0 proiecte reziliate
1 proiect retras de la AFIR în timpul procesului de evaluare

1 proiect finalizat
27.125,00 euro Total sumă plătită

✓ **proiectul este implementat de tânăr sub 40 de ani**

Pe Măsura 2 – „Sprijin pentru constituirea și promovarea formelor asociative” a fost implementat proiectul cu titlul „„Achiziție autoutilitară specializată la Cooperativa Agricolă de Gradul I Ecoleg Târgu Frumos” depus la Asociația GAL Iași Sud-Vest de către Cooperativa agricolă de gradul I Ecoleg Târgu Frumos.

Beneficiarul activează pe piața legumelor. Scopul cooperativei este de a sprijini producătorii locali de legume să își dezvolte potențialul de producție și implicit viabilitatea economică a fermelor. Cooperativa are 11 membri cooperatori. Împreună produc legume și le comercializează pe baza de comenzi ferme.

Cooperativa agricolă de gradul I Ecoleg Târgu Frumos a achiziționat o autospecială pentru transport frigorific a legumelor. Achiziția acestui mijloc de transport specializat a fost necesară întrucât asigură distribuția în condiții optime a produsele obținute în seră.

Cooperativa primește online comenzi pentru cosuri de legume pe care le distribuie direct la domiciliul consumatorilor.

Prin acest proiect se eficientizează lanțul scurt de aprovizionare (lanț alimentar care nu implică mai mult de un intermediar între producător și consumator) și crește calitatea produsului destinat pieței. De asemenea, importanța cooperativei reiese și din posibilitatea de a negocia contracte pentru cantități mai mari de produse cu clienți – persoane juridice, respectându-se cerințele legale de calitate.

În ce măsură intervenția SDL a contribuit la sprijinirea sectorului agricol și la creșterea competitivității firmelor din domeniul agricol?

- ✓ 11 exploatații agricole sprijinite
- ✓ 1 cooperativă sprijinită
- ✓ 16 locuri de muncă create
- ✓ 99,83% plăți raportate la alocarea financiară
- ✓ 3 din 12 proiecte sunt implementate de femei
- ✓ 10 din 12 proiecte sunt implementate de tineri sub 40 de ani (83,33%)
- ✓ 100% creștere grad de mecanizare (prin toate proiectele s-au achiziționat utilaje și tehnică agricolă)

Datorită achiziției de utilaje și tehnică agricolă nouă și eficientă:

- ✓ a crescut productivitatea muncii
- ✓ s-au redus costurile de producție (consumuri combustibil, piese de schimb, etc)

Concluzia și răspunsul final la întrebarea de evaluare:

În urma analizei rezultatelor celor două măsuri, considerăm că Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Iași Sud-Vest a sprijinit sectorul agricol și creșterea competitivității sectorului agricol în mare măsură.

TEMA DE EVALUARE (3): CONTRIBUȚIA SDL LA REDUCEREA DEPENDENȚEI POPULAȚIEI DE AGRICULTURĂ

Întrebarea de evaluare:

În ce măsură intervenția SDL a sprijinit afacerile non agricole și creșterea competitivității firmelor din domeniul non-agricol?

Așa cum reiese din analiza SWOT a Strategiei de Dezvoltare Locală sectorul non agricol este slab dezvoltat. Dezvoltarea sectorului non agricol este o necesitate stringentă și o alternativă pentru ocuparea forței de muncă. GAL dispune de resurse suficiente pentru

dezvoltarea sectorului non agricol (de. Ex. Patrimoniul istoric, cultural, de mediu, resurse materiale si umane).

Pentru a răspunde nevoilor identificate, în SDL s-au stabilit două măsuri incluse în domeniul de intervenție D.I. 3.1.:

D.I.3.1. Diversificarea activităților economice.

- Măsura 3 – „Sprijin pentru afaceri non-agricole”
- Măsura 4 – „Sprijin pentru activități turistice și recreative” (până la SDL versiunea 11 în care a fost eliminată din SDL)

Măsura 3 – „Sprijin pentru afaceri non agricole”

Scurtă descrierea măsurii

Măsura se justifică, alături de corelarea cu analiza SWOT, prin varietatea redusă a serviciilor și produselor oferite de societățile din domeniul non agricol în teritoriu și de costurile mari de aprovizionare ce duc implicit la creșterea prețurilor produselor.

Măsura 3 contribuie la obiectivul de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr 1305/2013 art. 4 prin:

- *Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.*

Valoarea adăugată a măsurii rezidă în:

- *Stimularea activităților economice din sfera serviciilor și a producției de pe teritoriul GAL*
- *Încurajarea fermierilor în schimbarea domeniului de activitate către afaceri non agricole*
- *Atragerea capitalurilor externe către teritoriul GAL*
- *Crearea de noi locuri de muncă*
- *Criteriile de selecție specifice*

Din criteriile de selecție specifice reiese că măsura și-a propus să sprijine într-o mai mare măsură:

- proiectele implementate de femei
- proiectele care generează locuri de muncă
- proiectele implementate de tineri până în 40 de ani
- responsabilizarea beneficiarului printr-un aport al contribuției proprii cât mai mare.

Date importante privind Măsura 3, în detaliu (în funcție de versiunea SDL):

Alocare financiară pe Măsura 3	Situație proiecte pe Măsura 3
Alocare financiară inițială 200.000,00 euro	1 sesiune depunere proiecte în perioada 30.06. – 14.08.2017 cu o alocare financiară de 200.000 euro Au fost depuse la GAL și selectate cu finanțare 2 proiecte în valoare de 198.157,50 euro

	Proiectele au fost contractate și finalizate
Alocare financiară pe măsură în SDL versiunea 4: 212.948,52 euro Realocare sume între măsuri: <i>pentru a putea lansa un nou apel și o nouă sesiune de depunere proiecte pe Măsura 3, s-au realocat sume rămase disponibile după închiderea altor măsuri, în urma selecției de proiecte</i> <i>Realocarea s-a realizat de la măsurile M1, M2, M5, M6, M7</i>	1 sesiune depunere proiecte în perioada 16.07. – 30.07.2018 cu o alocare financiară de 14.791,02 euro A fost depus la GAL și selectat cu finanțare 1 proiect în valoare de 14.781,00 euro Proiectul a fost contractat și finalizat
Alocare financiară pe măsură în SDL versiunea 11: 232.792,53 euro Realocare sume între măsuri: <i>pentru a putea lansa un nou apel și o nouă sesiune de depunere proiecte pe Măsura 3, s-au realocat sume rămase disponibile după închiderea altor măsuri, în urma selecției de proiecte</i> <i>Realocarea s-a realizat de la măsurile M9 și de la M4 (măsură desființată)</i>	1 sesiune depunere proiecte în perioada 08.11. – 17.11.2021 cu o alocare financiară de 21.832,62 euro A fost depus la GAL și selectat cu finanțare 1 proiect în valoare de 21.825,00 euro Proiectul a fost contractat și finalizat
Alocare financiară pe măsură în SDL versiunea 12: Fonduri FEADR: 232.792, 53 euro Fonduri EURI: 119.995,72 euro <i>În urma primirii fondurilor din EURI, s-a suplimentat alocarea financiară pe Măsura 3 cu 119.995,72 euro, distinct de fondurile din FEADR.</i>	1 sesiune depunere proiecte în perioada 03.10-12.10.2022 cu o alocare financiară de 119.995,72 euro din fonduri EURI Au fost depuse la GAL și selectate cu finanțare 2 proiecte în valoare de 119.995,20 euro. Proiectele au fost contractate și finalizate

În sinteză, pe Măsura 3 prezentăm următoarele date:

6 proiecte SELECTATE la nivel de GAL (4 din fonduri FEADR și 2 din fonduri EURI)
354.758,70 euro valoarea publică a proiectelor selectate

6 proiecte contractate
354.758,7 euro valoarea proiectelor contractate

0 proiecte reziliate

6 proiecte finalizate
352.129,57 euro Total sumă plătită

- ✓ **1 din 6 proiecte implementate de femei**
- ✓ **4 din 6 proiecte sunt implementate de tineri sub 40 de ani**

Indicatorii pe Măsura 3 au fost depășiți față de cei asumați în SDL:

Denumire indicator	Indicator planificat în SDL	Indicator realizat	Grad de realizare
Realizarea de locuri de muncă	1	9	900%
Afaceri non-agricole sprijinite	2	6	300%
Total investiții (euro)	150.000,00	352.129,57	235%

Beneficiari direcți ai măsurii sunt beneficiarii care au realizat proiecte pe această măsură, iar beneficiarii indirecti sunt persoanele angajate și cetățenii deserviți.

Beneficiarii Măsurii 3, prin implementarea proiectelor, au realizat achiziții de utilaje, echipamente, dotări în domenii diverse de activitate, de la producția de mobilă, vulcanizare, construcții, până la echipamente de proiectare și design specializat:

- ✓ Utilaje producție mobilă – Centru CNC, mașină canturi, centru secționat panouri
- ✓ Buldoexcavator și minibuldoexcavator
- ✓ Stivuitor diesel
- ✓ Echipamente service vulcanizare
- ✓ Echipamente proiectare și design specializat – echipamente IT specializate

Implementarea proiectelor conduce la îmbunătățirea și stimularea serviciilor pentru populația rurală și reducerea diferențelor dintre mediul rural și cel urban. Bunurile achiziționate sunt de ultimă generație / tehnologie.

Proiectele promovează dezvoltarea durabilă în spațiul rural. Implementarea acestora respectă legislația națională în domeniul protecției mediului.

Astfel, prin achiziția utilajelor propuse, solicitanții vin în întâmpinarea obiectivelor și acțiunilor eligibile din SDL contribuind la îndeplinirea acestora și aducând un aport de ordin economic și social.

Serviciile și produsele oferite pieței se diversifică, au o calitate ridicată și cu siguranță au câștigat noi segmente de piață.

În concluzie putem aprecia că impactul măsurii a generat următoarele rezultate:, firmele din domeniul non-agricol sunt mai cunoscute, a crescut productivitatea muncii, au fost reduse pierderile datorită realizării lucrărilor la timp, au fost reduse costurile de producție, a crescut calitatea produselor, a crescut numărul de clienți.

A doua măsură din SDL care răspunde temei de evaluare – Contribuția SDL la întărirea sectorului agricol este:

Măsura 4 – „Sprijin pentru activități turistice și recreaționale”


Valoarea adăugată a măsurii rezidă în:

- Stimularea activităților economice din sfera turismului, alimentației publice și a activităților recreaționale de pe teritoriul GAL
- Încurajarea fermierilor în schimbarea domeniului de activitate
- Crearea de noi locuri de muncă
- Criteriile de selecție specifice

Alocare financiară pe Măsura 4	Situație proiecte pe Măsura 4
Alocare financiară inițială 123.479,34 euro	1 sesiune depunere proiecte în perioada 31.07. – 22.09.2017 cu o alocare financiară de 123.479,34 euro A fost depus la GAL și selectat cu finanțare 1 proiect în valoare de 79.994,00 euro Proiectul a fost contract și apoi a fost reziliat.
Alocare financiară pe măsură în SDL versiunea 5: 14.994,00	1 sesiune depunere proiecte în perioada 17.04. – 24.05.2019 cu o alocare financiară de 79.965,00 euro A fost depus la GAL și selectat cu finanțare 1 proiect în valoare de 14.994,00 euro Proiectul a fost retras de la AFIR.
Alocare financiară pe măsură în SDL versiunea 6: 14.994,00	1 sesiune depunere proiecte în perioada 24.06. – 03.07.2019 cu o alocare financiară de 14.994,00 euro A fost depus la GAL și selectat cu finanțare 1 proiect în

	valoare de 14.994,00 euro
	Proiectul a fost contract și apoi a fost reziliat.
Alocare financiară pe măsură în SDL versiunea 10: 14.994 euro	1 sesiune depunere proiecte în perioada 20.08-20.09.2021 cu o alocare financiară de 14.994,00 euro Nu au mai fost depuse proiecte pe măsură. Măsura nu a mai prezentat interes și a fost desființată. A existat interes crescut pentru Măsura 3, din același domeniu de intervenție și care răspunde aceluiași obiectiv din SDL.

În sinteză, pe Măsura 4 prezentăm următoarele date:

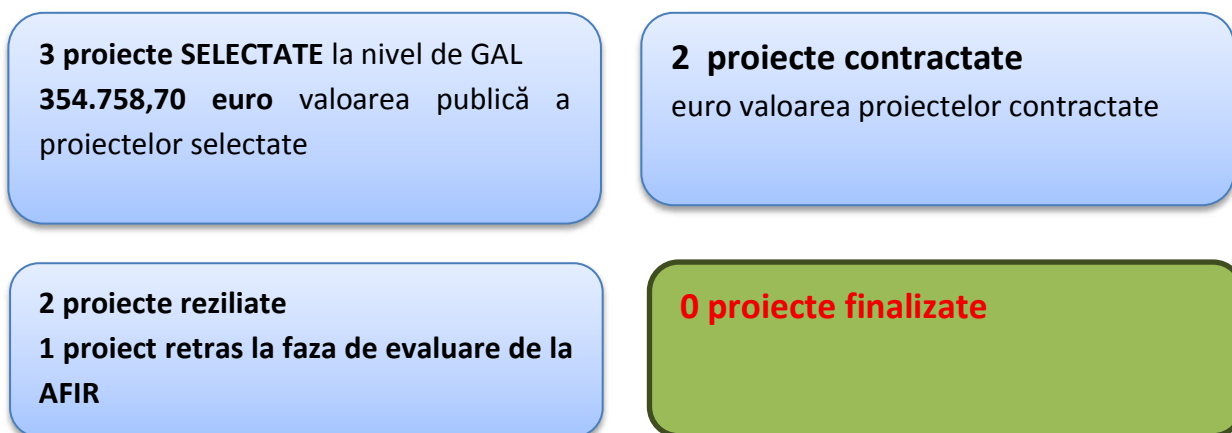

- Măsura a fost desființată din cauza scăderii în timp a interesului beneficiarilor pentru aceasta.

În ce măsură intervenția SDL a sprijinit afacerile non-agricole și creșterea competitivității firmelor din domeniul non-agricol?

- ✓ 6 proiecte în domeniul afacerilor non-agricole sprijinite
- ✓ 9 locuri de muncă create în domeniul non-agricol
- ✓ 99,83% plăți raportate la alocarea financiară
- ✓ 100% proiecte finalizate
- ✓ 1 din 6 proiecte este implementat de o femeie
- ✓ 4 din 6 proiecte sunt implementate de tineri (66,7%)

Datorită achiziției de utilajelor, dotărilor și a echipamentelor noi:

- ✓ A crescut productivitatea muncii și au scăzut timpii de livrare
- ✓ Au putut fi lansate produse și servicii noi

Concluzia și răspunsul final la întrebarea de evaluare:

Deși Măsura 4 a fost desființată începând cu SDL versiunea 11, prin rezultatele obținute de Măsura 3 care a răspuns aceluiași obiectiv din SDL, considerăm că Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Iași Sud-Vest a sprijinit sectorul non-agricol și creșterea competitivității firmelor din sectorul non-agricol în mare măsură.

TEMA DE EVALUARE (4): CONTRIBUȚIA SDL LA DEZVOLTAREA UNEI INFRASTRUCTURI DE BAZĂ MODERNE

Întrebarea de evaluare:

În ce măsură a sprijinit intervenția SDL dezvoltarea unei infrastructuri de bază

În cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Iași Sud-Vest există **5 măsuri, incluse în trei domenii de intervenții** care răspund obiectivului – Creșterea bunăstării populației prin dezvoltarea unei infrastructuri de bază moderne:

D.I.1.1. Refacerea, conservarea și dezvoltarea patrimoniului local și de mediu:

- Măsura 5 – „Sprijin pentru punerea în valoare a patrimoniului local, meșteșugurilor și obiceiurilor locale”
- Măsura 6 – „Sprijin pentru acțiuni de mediu”

D.I. 1.2. Dezvoltarea infrastructurii locale

- Măsura 7 – „Sprijin pentru înființarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii”
- D.I. 1.3. Încurajarea activităților pentru incluziunea socială a grupurilor defavorizate*
- Măsura 8 – „Sprijin pentru investiții în infrastructura socială”
- Măsura 9 – „Sprijin pentru integrarea minorităților locale”

Măsurile enumerate răspund obiectivelor de dezvoltare locală în zonele rurale conform Reg. U.E. 1305/2013 Art.5, 6B.

Vom prezenta, pe rând fiecare măsură, ce s-a realizat pe fiecare măsură: alocarea financiară în funcție de versiunea SDL, Sesiuni depunere proiecte, numărul și valoarea proiectelor depus, a celor selectate, contractate, valoarea plăților, indicatorii de monitorizare realizați și alte informații importante.

Măsura 5 „Sprijin pentru punerea în valoare a patrimoniului local, meșteșugurilor și obiceiurilor locale”

Măsura 5 face parte din domeniul de intervenție *D.I.1.1. Refacerea, conservarea și dezvoltarea patrimoniului local și de mediu*

Prin Strategia de Dezvoltare Locală măsura și-a propus:

- Reabilitarea clădirilor de patrimoniu
- Punerea în valoare a patrimoniului mobil și imobil de pe teritoriul GAL
- Modernizarea infrastructurii de acces

Date importante privind Măsura 5, în detaliu, în funcție de versiunea SDL

Alocare financiară pe Măsura 5	Situație proiecte pe Măsura 5
Alocare financiară inițială 30.000,00 euro	1 sesiune depunere proiecte în perioada 05.10. – 13.11.2017 cu o alocare financiară de 30.000,00 euro A fost depus la GAL și selectat cu finanțare 1 proiect în valoare de 12.684,60 euro Proiectul a fost contractat și finalizat
Alocare financiară pe măsură în SDL versiunea 3: 30.000,00 euro	1 sesiune depunere proiecte în perioada 01.03. – 20.03.2018 cu o alocare financiară de 17.315,40 euro A fost depus la GAL și selectat cu finanțare 1 proiect în valoare de 15.000,00 euro Proiectul a fost contractat și finalizat
Alocare financiară pe măsură în SDL versiunea 8: 39.358,45 euro	1 sesiune depunere proiecte în perioada 13.08. – 11.09.2020 cu o alocare financiară de 11.673,85 euro

	A fost depus la GAL și selectat cu finanțare 1 proiect în valoare de 11.673,00 euro Proiectul a fost selectat cu finanțare, dar ulterior a fost retras de la AFIR.
Alocare financiară pe măsură în SDL versiunea 10: 39.358,45 euro	1 sesiune depunere proiecte în perioada 20.08-20.09.2021 cu o alocare financiară de 11.673,85 euro A fost depus la GAL și selectat cu finanțare 1 proiect în valoare de 11.673,00 euro Proiectul a fost contractat și finalizat

În sinteză, pe Măsura 5 prezentăm următoarele date:

4 proiecte SELECTATE la nivel de GAL
51.030,60 euro valoarea publică a proiectelor selectate

3 proiecte contractate
39.357,60 euro valoarea proiectelor contractate

0 proiecte reziliate
1 proiect retras de la AFIR în faza de evaluare

3 proiecte finalizate
38.926,74 euro Total sumă plătită

Lista proiectelor pe Măsura 5

Beneficiar	Titlu proiect	Realizări
Comuna Butea	Dotare Cămin Cultural "Ludovic Antal" din Comuna Butea, județul Iași	Au fost achiziționate costume populare și instrumente muzicale pentru dotarea căminului cultural
Comuna Ruginoasa	„Punerea în valoare a patrimoniului Comunei Ruginoasa prin achiziționarea de bunuri”	Au fost achiziționate costume și măști populare pentru dotare muzeu cu specificul obiceiurilor de

		iarnă din Ruginoasa
Asociația Culturală MIR	"Punerea în valoare a patrimoniului comunității rușilor lipoveni din orașul Târgu Frumos"	Au fost achiziționate servicii de documentare privind documentare comunitatea rușilor lipoveni și realizare platformă digitală – tip arbore genealogic

Măsura 6 „Sprijin pentru acțiuni de mediu”

Măsura 6 face parte din domeniul de intervenție *D.I.1.1. Refacerea, conservarea și dezvoltarea patrimoniului local și de mediu*

Prin Strategia de Dezvoltare Locală măsura și-a propus:

- Educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului și a măsurilor ce trebuie luate în această direcție
- Creșterea vizibilității și accesibilității patrimoniului de mediu
- Reducerea poluării și a impactului populației asupra mediului
- Creșterea cantității de deșeuri colectate selectiv
- Creșterea suprafețelor spațiilor verzi din localități și apropierea mărimii acestora, pe cap de locuitor, de standardele europene prin dezvoltarea și modernizarea spațiilor verzi din localități și înființarea de noi parcuri, scuaruri și aliniamente plantate ori reabilitarea celor existente.
- Ameliorarea gestionării solului

Date importante privind Măsura 6, în detaliu, în funcție de versiunea SDL

Alocare financiară pe Măsura 6	Situație proiecte pe Măsura 6
Alocare financiară inițială 90.000 euro	1 sesiune depunere proiecte în perioada 22.06. – 21.07.2017 cu o alocare financiară de 90.000 euro A fost depus la GAL și selectat cu finanțare 1 proiect în valoare de 69.931,00 euro Proiectul a fost contractat și finalizat
Alocare financiară pe măsură în SDL versiunea 3: 118.806,12 euro	1 sesiune depunere proiecte în perioada 01.03.2018 - 20.03.2018 cu o alocare financiară de 48.875,12 euro În această sesiune nu a fost depus niciun proiect 1 sesiune depunere proiecte în perioada 10.04.2018 - 19.04.2018 cu o alocare financiară de 48.875,12 euro A fost depus la GAL și selectat cu finanțare 1 proiect în valoare de 48.721,00 euro Proiectul a fost contractat și finalizat.

În sinteză, pe Măsura 6 prezentăm următoarele date:

2 proiecte SELECTATE la nivel de GAL
118.652,10 euro valoarea publică a proiectelor selectate

2 proiecte contractate
118.428,00 euro valoarea proiectelor contractate

0 proiecte reziliate

2 proiecte finalizate
108.554,28 euro Total sumă plătită

Lista proiectelor pe Măsura 6

Beneficiar	Titlu proiect	Realizări
Comuna Strunga	Modernizare și reabilitare parc în Comuna Strunga, Județul Iași	A fost reabilitat și dotat parcul din Comuna Strunga, județul Iași
Comuna Mogoșești-Siret	"Spațiu public de recreere în Comuna Mogoșești-Siret, județul Iași"	Au fost realizate lucrări și dotări pentru spațiu public de recreere în Comuna Mogoșești-Siret, județul Iași

Măsura 7 „Sprijin pentru punerea în valoare a patrimoniului local, meșteșugurilor și obiceiurilor locale”

Măsura 7 face parte din domeniul de intervenție *D.I. 1.2. Dezvoltarea infrastructurii locale*

Prin Strategia de Dezvoltare Locală măsura și-a propus:

- Dezvoltarea infrastructurii de bază
- Reducerea decalajului rural – urban
- Creșterea numărului de locuitori ce au acces la infrastructura de bază

Date importante privind Măsura 7, în detaliu, în funcție de versiunea SDL

Alocare financiară pe Măsura 7	Situație proiecte pe Măsura 7
Alocare financiară inițială 648.245,06 euro	1 sesiune depunere proiecte în perioada 30.06. – 31.08.2017 cu o alocare financiară de 648245,06 euro Au fost depuse la GAL și selectate cu finanțare 11 proiecte în valoare de 611.709,00 euro Proiectele au fost contractate și finalizate.

Alocare financiară pe măsură în SDL versiunea 12: 738.220,60	1 sesiune depunere proiecte în perioada 05.10. – 26.10.2022 cu o alocare financiară de 157.389,65 euro Au fost depuse la GAL și selectate cu finanțare 3 proiecte în valoare de 151.235,00 euro Proiectele au fost contractate și finalizate.
---	--

În sinteză, pe Măsura 7 prezentăm următoarele date:

14 proiecte SELECTATE la nivel de GAL
762.944,00 euro valoarea publică a
proiectelor selectate

14 proiecte contractate
753.498,00 euro valoarea proiectelor
contractate

0 proiecte reziliate

14 proiecte finalizate
730.187,90 euro Total sumă plătită

Lista proiectelor pe Măsura 7

Beneficiar	Titlu proiect	Realizări
Comuna Gherăești	Achiziție utilaj specializat	A fost achiziționat un Buldoexcavator
Comuna Balș	Achiziție utilaj specializat	A fost achiziționat un utilaj specializat pentru material antiderapant
Comuna Botești	Achiziție utilaj specializat	A fost achiziționat un buldoexcavator -
Comuna Ruginoasa	Achiziție utilaj specializat	A fost achiziționat un buldoexcavator
Comuna Alexandru Ioan Cuza	Achiziție utilaj specializat în comuna Alexandru Ioan Cuza	A fost achiziționat un utilaj specializat bena si pentru raspandire material antiderapant
Comuna Costești	"Achiziție utilaj specializat în Comuna Costești"	A fost achiziționat un utilaj specializat raspindire material antiderapant
Comuna Mircești	"Construire teren de sport multifuncțional sat Mircești, comuna Mircești, județul Iași, Construire teren de sport multifuncțional sat Iugani, comuna Mircești, județul Iași"	Au fost construite două terenuri de sport multifuncționale
Comuna Mogoșești- Siret	"Realizare șanțuri de pământ și accese proprietăți pe drumul comunal DC104 în comuna Mogoșești-Siret, județul Iași"	Au fost executate lucrări pentru realizare șanțuri de pământ și accese proprietăți

Comuna Hălăucești	"Modernizare drumuri satești DS87 și DS97, în Comuna Hălăucești, județul Iași"	Au fost executate lucrări de modernizare drumuri satești
Comuna Cucuteni	"Modernizare drumuri locale în Comuna Cucuteni, Județul Iași"	Au fost executate lucrări de modernizare drumuri locale
Comuna Butea	"Reabilitare, consolidare, modificări acoperiș și extindere la construcția existentă - sediul primăriei"	Au fost executate lucrări de modernizare a clădirii primăriei
Comuna Heleșteni	"Achiziție echipamente multifuncționale pentru serviciul public în comuna Heleșteni, județul Neamț"	Au fost achiziționate echipamente multifuncționale pentru serviciul public
Comuna Cucuteni	"Achiziție autoutilitară multifuncțională pentru deszăpezire în comuna Cucuteni, județul Iași"	A fost achiziționată o autoutilitară multifuncțională pentru deszăpezire
Comuna Butea	"Achiziție autobasculantă pentru serviciul public de gospodărire comunală din comuna Butea, județul Iași"	A fost achiziționată o autobasculantă pentru serviciul public de gospodărire comunală

Măsura 8 „Sprijin pentru punerea în valoare a patrimoniului local, meșteșugurilor și obiceiurilor locale”

Măsura 8 face parte din domeniul de intervenție *D.I. 1.3. Încurajarea activităților pentru incluziunea socială a grupurilor defavorizate*

Prin Strategia de Dezvoltare Locală măsura și-a propus:

- ameliorarea calității vieții populației de alte etnii și în special a celei rome
- reducerea sau eliminarea efectelor de segregare populației
- modernizarea infrastructurii de bază în zonele populate de etnii
- creșterea identității locale și a profilului local
- 34,39% din populație, respectiv tinerii până în 24 ani, aparțin categoriei de populație celei mai expuse riscului de sărăcie
- Existența unei zone ce poate fi definită ca fiind segregată, în teritoriu.

Date importante privind Măsura 8, în detaliu, în funcție de versiunea SDL

Alocare financiară pe Măsura 8	Situație proiecte pe Măsura 8
Alocare financiară inițială 60.000,00 euro	1 sesiune depunere proiecte în perioada 22.06. – 04.08.2017 cu o alocare financiară de 60.000,00 euro A fost depus la GAL și selectat cu finanțare 1 proiect în valoare de 59.997,00 euro Proiectul a fost contractat și finalizat.

În sinteză, pe Măsura 8 prezentăm următoarele date:

1 proiect SELECTAT la nivel de GAL
59.997,00 euro valoarea publică a proiectului selectat

1 proiect contractat
59.997,00 euro valoarea proiectelor contractate

0 proiecte reziliate

1 proiect finalizat
56.142.12 euro Total sumă plătită

✓ 30 de copii beneficiari ai centrului de zi

Lista proiectelor pe Măsura 8

Beneficiar	Titlu proiect	Realizări
Comuna Heleșteni	Modernizare și dotare bucătărie centru de zi	Au fost realizate lucrări construcții, a fost achiziționat mobilier și dotări pentru cantină

Măsura 9 „Sprijin pentru punerea în valoare a patrimoniului local, meșteșugurilor și obiceiurilor locale”

Măsura 9 face parte din domeniul de intervenție D.I. 1.3. *Încurajarea activităților pentru incluziunea socială a grupurilor defavorizate* Prin Strategia de Dezvoltare Locală măsura și-a propus:

- Creșterea calității vieții etnicilor, și în special a celei rome, cu accent pe reducerea sau eliminarea efectelor de segregare
- Promovarea identității naționale a etnicilor

Date importante privind Măsura 9, în detaliu, în funcție de versiunea SDL

Alocare financiară pe Măsura 9	Situație proiecte pe Măsura 9
Alocare financiară inițială 100.000,00 euro	1 sesiune depunere proiecte în perioada 30.06. – 31.08.2017 cu o alocare financiară de 100.000,00 euro A fost depus la GAL și selectat cu finanțare 1 proiect în valoare de 100.000,00 euro Proiectul a fost contractat și finalizat.

În sinteză, pe Măsura 9 prezentăm următoarele date:

1 proiect SELECTAT la nivel de GAL
100.000,00 euro valoarea publică a proiectului selectat

1 proiect contractat
100.000,00 euro valoarea proiectului contractat

0 proiecte reziliate

1 proiect finalizat
93.161,38 euro Total sumă plătită

- ✓ **520 de persoane - populație de etnie romă care beneficiază de servicii și infrastructuri îmbunătățite.**

Lista proiectelor pe Măsura 9

Beneficiar	Titlu proiect	Realizări
Oraș Târgu Frumos	"Modernizare strada George Coșbuc care deservește comunitatea romă limitrofă"	A fost modernizată strada George Coșbuc care deservește comunitatea romă limitrofă din orașul Târgu Frumos.

Unitățile administrativ teritoriale, prin proiectele depuse la Asociația GAL Iași Sud-Vest și-au propus **să îmbunătățească infrastructura și serviciile** pentru creșterea calității vieții cetățenilor din mediul rural.

Așa cum se observă din tabelele prezentate,

Comunele au achiziționat utilaje specializate pentru Serviciile de Gospodărire comună (de exemplu: autobasculantă cu sărăriță, utilaj pentru împrăștiere material antiderapant, buldoexcavator), au realizat și modernizat drumuri sătești și locale, șanțuri și podețe pentru drumuri sau au construit terenuri de sport multifuncționale. Prin Măsura 5 și-au propus conservarea patrimoniului cultural și a tradițiilor locale prin: achiziția de costume populare și instrumente muzicale pentru Căminul Cultural și înființarea unui muzeu de măști tradiționale. Prin Măsura 8, singura comună care are un proiect în derulare, a modernizat și dotat centrul de zi unde pot lua masa zilnic 30 de copii care provin din familii defavorizate. La nivel de GAL, în urma implementării proiectelor pe aceste măsuri de către beneficiarii publici au fost angajate 9 persoane.

Investițiile susținute au fost necesare și oportune pentru dezvoltarea infrastructurii comunelor, în vederea îmbunătățirii calității vieții cetățenilor din fiecare UAT și răspund obiectivelor SDL a GAL Iași Sud-Vest. Dezvoltarea unei infrastructuri de bază moderne oferă suportul dezvoltării afacerilor, contribuie la reducerea costurilor de operare, consumurilor mici, oferind oportunitatea unor afaceri eficiente. Infrastructurile și serviciile îmbunătățite creează oportunități de dezvoltare și creștere a afacerilor agenților economici ducând implicit la o creștere a ofertei locurilor de muncă pe piața locală.

Toate UA-urile au depus proiecte pe măsuri care răspund obiectivului privind dezvoltarea locală în mediul rural și reducerea decalajelor rural-urban. Se observă o distribuție omogenă și completă în teritoriul GAL a proiectelor de dezvoltare locală în zonele rurale. Un procent de 100% din populație beneficiază de servicii și infrastructuri îmbunătățite.

Conform recensământului din anul 2011, Asociația GAL Iași Sud-Vest are o populație de 47.324 locuitori în zonele rurale (cele 13 comune componente ale asociației) și 10.475 de locuitori în orașul Târgu Frumos.

Pe lângă populația rurală, persoane fizice, toți agenții economici din localitățile vizate de proiectele implementate, dar și instituțiile publice și de cult beneficia de infrastructuri și servicii îmbunătățite.

În ce măsură a sprijinit intervenția SDL dezvoltarea unei infrastructuri de bază moderne?

- ✓ 5 măsuri care au răspuns obiectivului de dezvoltare rurală prin dezvoltarea unei infrastructuri de bază moderne, măsuri ce acoperă 3 domenii de intervenție
- ✓ 21 de proiecte implementate și finalizate privind dezvoltarea unei infrastructuri de bază moderne
- ✓ 100% procent populație beneficiară de infrastructuri îmbunătățite și modernizate
- ✓ 14 UAT-uri din 14 au implementat și finalizat proiecte
- ✓ 520 de persoane - populație de etnie romă care beneficiază de servicii și infrastructuri îmbunătățite.
- ✓ 30 de copii beneficiari ai centrului de zi

Datorită implementării și finalizării proiectelor:

- ✓ A crescut bunăstarea populației

Concluzia și răspunsul final la întrebarea de evaluare:

În urma analizei și interpretării rezultatelor celor cinci măsuri, considerăm că Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Iași Sud-Vest a sprijinit dezvoltarea unei infrastructuri de bază moderne în mare măsură.

TEMA DE EVALUARE (5): VALOAREA ADĂUGATĂ DATORATĂ METODEI LEADER

Întrebarea de evaluare:

Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER ? (dezvoltarea capitalului social local, rezultatele obținute prin implementarea strategiei, îmbunătățirea guvernancei locale)

Prin definiția sa, LEADER este o inițiativă comunitară europeană pentru sprijinirea comunităților rurale în ceea ce privește îmbunătățirea calității vieții și a prosperității economice. Abordarea LEADER de „jos în sus” oferă teritoriilor rurale posibilitatea să exploateze modalități noi prin care să devină sau să rămână competitive, să își valorifice bunurile și resursele la maxim, să depășească dificultățile pe care le întâmpină.

Abordarea LEADER la nivelul teritoriului Asociația Grupul de Acțiune Locală Iași Sud Vest a urmărit să ofere comunității o metodă de implicare a partenerilor locali în orientarea dezvoltării viitoare a teritoriului. Importanța implementării LEADER în teritoriului GAL este dată de impactul așteptat al acestuia și anume de a capacita resursele locale în a lucra împreună și a crea proiecte care să ducă la o îmbunătățire a vieții comunității.

Conceptul fundamental din spatele abordării LEADER este că, dată fiind diversitatea zonelor rurale europene, strategiile de dezvoltare locală sunt mai productive și mai eficiente, **dacă sunt decise și implementate la nivel local, de către actorii locali**, care utilizează proceduri clare și transparente și beneficiază de susținerea administrațiilor publice corespunzătoare și de asistența tehnică necesară transiterii bunelor practici. Diferența dintre LEADER și alte măsuri

mai tradiționale de politică rurală constă în faptul că aceasta arată „cum” trebuie procedat și nu „ce” trebuie făcut.

Abordarea LEADER

- Strategii de dezvoltare locală axate pe zonă
- Elaborarea și implementarea strategiilor de „jos în sus”
- Parteneriate locale public-privat: grupurile de acțiune locală
- Acțiuni integrate și multisectoriale
- Inovație
- Cooperare
- Stabilirea de contacte în rețea

Strategia de Dezvoltare Locală axată pe zonă:

Teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală Iași Sud-Vest este unul omogen geografic, economic și social. Acesta are un grad de ruralitate pronunțat, respectiv de 81,88% - 47.324 locuitori în zona rurală. Densitatea populației la nivelul GAL este de 108,43 locuitori/kmp. Populația din GAL este multietnică și multiconfesională. Teritoriul este caracterizat de un grad de sărăcie pronunțat (9 din 14 unități administrativ teritoriale având IDUL sub 55), fiind subdezvoltat atât economic cât și ca infrastructură.

Din punctul de vedere al economiei zonei, aceasta se bazează preponderent pe agricultură, serviciile și industria fiind slab reprezentate și dezvoltate.

Având ca punct de reper o astfel de zonă (teritoriul GAL), s-a efectuat mai ușor recunoașterea punctelor locale forte și slabe, a riscurilor, a oportunităților și a potențialului, precum și identificarea piedicilor majore în calea dezvoltării durabile.

Abordarea „*de jos în sus*” este evidentă la Asociația GAL Iași Sud-Vest încă din faza de culegere a informațiilor, proiectare și elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020. În perioada 05.02.2016 – 10.02.2016 pe teritoriul Asociației GAL Iași Sud-Vest au avut loc activități de animare în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală la care au participat persoane care au reprezentat toate sectoarele de activitate, reprezentanți ai CDRJ, diverși actori locali. Scopul urmărit de întâlniri a fost stabilirea contactului cu populația din teritoriu și formarea unor grupuri de lucru tematice, cu contribuție directă în elaborarea SDL. S-au prezentat noțiuni de bază privind programul LEADER, ce reprezintă și ce face un Grup de Acțiune Locală, cine este Asociația Grupul de Acțiune Locală Iași Sud-Vest (teritoriu, parteneriat, activități pe care le

desfășoară etc.). Prezentările au fost interactive și deschise, astfel s-a dat posibilitatea participanților, reprezentanți ai populației de pe teritoriul GAL de a interveni și a face propuneri și observații. De asemenea, s-au format grupuri de lucru tematice pe principalele domenii, având membri reprezentanți ai domeniului public și privat.

Implicarea activă a comunității: o strategie de dezvoltare locală are șanse mai mari de succes dacă este concepută și implementată cu participarea activă a locuitorilor, liderilor locali, organizațiilor non-guvernamentale și mediului de afaceri. Implicarea comunității asigură o mai bună adaptare a strategiei la nevoile și așteptările locale, crește sentimentul de proprietate asupra proiectului și facilitează asumarea responsabilității pentru implementare.

Într-o abordare „de jos în sus”, actorii locali participă la luarea de decizii privind strategia de dezvoltare, precum și la selectarea priorităților care trebuie urmărite în zona lor locală:

În perioada 15.02.2016 – 23.02.2016 au funcționat la sediul GAL grupurile de lucru tematice:

- Grupul de lucru pe agricultură
- Grupul de lucru pe Industrie, comerț și IMM
- Grupul de lucru Sănătate, cultură, învățământ

În cadrul fiecărui grup de lucru s-au făcut prezentări ale analizei diagnostic corectate cu propunerile din consultările publice și s-a realizat analiza SWOT pe fiecare domeniu în parte. De asemenea, **în cadrul fiecărui grup de lucru s-au stabilit principalele obiective în legătură cu dezvoltarea rurală a zonei, prioritățile, valoarea adăugată, indicatorii de realizare, măsurile de finanțare ce urmează a fi implementate pe fiecare domeniu.**

În grupurile de lucru tematice s-au propus anumite direcții de dezvoltare prin Strategia de Dezvoltare Locală.

Prin aplicarea metodelor LEADER la nivelul teritoriului Asociației GAL Iași Sud-Vest, **s-a îmbunătățit mult capitalul social** prin aspectele sale: învățarea colectivă, schimbarea mentalităților, creșterea colaborării și încrederii reciproce și fata de GAL , identificarea unor subiecte de interes comun.

Valoarea adăugată datorată metodelor LEADER reiese și din componența și funcționarea organismelor decizionale ale Asociației GAL Iași Sud-Vest :

- Adunarea Generală a Asociațiilor
- Consiliul Director
- Comitetul de selecție a proiectelor

Asociația GAL Iași Sud-Vest asociază parteneri publici, privați și grupurile locale de interes existente, derivate din diferitele sectoare socio economice din zonă. La nivelul luării deciziilor, partenerii privați și asociațiile sunt majoritari. Parteneriatul GAL Iași Sud-Vest are în componența sa 22,95% parteneri publici și 77,05% parteneri privați.

Consiliul Director este format dintr-un număr de 7 membrii, din care 28,57% aparțin sectorului public și 71,43% sectorului privat .

Comitetul de selecție a proiectelor are ca principală atribuție selectarea proiectelor depuse la GAL. Acesta este compus din 7 membri: 5 membri sunt din partea partenerilor privați (4 agenți economici și 1 ONG) și 2 din partea instituțiilor/autorităților publice.

Pentru selecția proiectelor se aplică regula „dublului cvorum”.

GAL Iași Sud-Vest a decis conținutul SDL prin consultare și cu aportul partenerilor și comunității.

Prin implicarea sporită a comunității și factorilor interesați în luarea deciziilor și în selecția proiectelor, afirmăm că guvernanta locală s-a îmbunătățit într-o mare măsură. Considerăm că Asociația GAL Iași Sud-Vest are un rol foarte important în guvernanta pe diferite niveluri și are o mare capacitate în gestionarea fondurilor europene.

În Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Iași Sud-Vest au existat nouă măsuri de finanțare ce răspund nevoilor identificate la nivelul teritoriului GAL. Actorii locali s-au implicat și au venit cu sugestii și idei în definirea măsurilor astfel încât să răspundă cât mai bine nevoilor locale.

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Iași Sud-Vest, în urma finalizării proiectelor, a generat datorită metodei LEADER multiple rezultate pozitive în teritoriul GAL și pentru populația acestuia:

a)

- Modernizare sector agricol prin achiziție de utilaje performante
- Eficientizarea activităților agricole
- Permite aplicarea tehnologiilor prietenoase cu mediul
- Încurajează inițiativele promovate de tineri și femei
- Încurajarea asocierii
- Se creează cadru propice pentru transferul de informații

b)

- Diversificarea serviciilor și a produselor puse la dispoziția cetățeanului
- Creșterea ofertei de produse și servicii
- Eficientizarea activităților non-agricole
- Creșterea calității serviciilor și produselor
- Diversificarea domeniilor de activitate a fermierilor
- Pune în valoare resursele locale naturale și potențialul turistic
- Stimulează inițiativele promovate de tineri și femei
- Creează locuri de muncă

c)

- Crește vizibilitatea și accesibilitatea patrimoniului de mediu
- Crește suprafața ocupată de spații verzi
- Se creează spații de recreere pentru copii și adulți
- Îmbunătățește calitatea aerului

d)

- Pune în valoare patrimoniul cultural al teritoriului
- Asigură conservarea identității locale
- Păstrează vii tradiții și meșteșuguri locale

- e)
 - Modernizarea serviciilor publice locale
 - Modernizarea infrastructurii de bază a UAT-urilor
 - Reduce decalajul rural-urban
 - Crește nivelul de trai
 - Teritoriul devine atractiv pentru tineri și diaspora
- f)
 - Modernizarea infrastructurii care oferă servicii sociale copiilor
 - Ofertă de sprijin pentru categorii de copii defavorizați
- g)
 - Creare de infrastructură destinată etnicilor romi
 - Creșterea nivelului de trai în zona locuită de etnici romi

- ✓ Îmbunătățirea capitalului social datorată metodei LEADER a înregistrat o **îmbunătățire mare**
- ✓ Putem aprecia rezultatele SDL ca fiind **foarte bune**
- ✓ Rezultatele foarte bune s-au datorat aplicării metodei LEADER **în mare măsură**
- ✓ Îmbunătățirea Guvernanței locale datorită metodei LEADER: **îmbunătățire mare**
- Îmbunătățirea calității vieții prin aplicarea metodei LEADER:**
- ✓ 25 de locuri de muncă create în mediul privat (16 în domeniul agricol, 9 în non-agricol)
- ✓ 9 locuri de muncă în domeniul public, legat de proiectele implementate
- ✓ 13 tineri până în 40 de ani sprijiniți prin implementarea proiectelor
- ✓ 4 femei sprijinite
- ✓ 100% procent populație beneficiară de infrastructuri îmbunătățite și modernizate
- ✓ 14 UAT-uri din 14 au implementat și finalizat proiecte (100%)
- ✓ 520 de persoane - populație de etnie romă care beneficiază de servicii și infrastructuri îmbunătățite.
- ✓ 30 de copii din familii defavorizate, beneficiari ai centrului de zi

Concluzia și răspunsul final la întrebarea de evaluare:

În urma analizei efectuate considerăm că succesul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Iași Sud-Vest s-a datorat respectării principiilor LEADER în mare măsură.

7 FACTORII DE SUCCES ȘI INSUCES

Care sunt factorii interni și externi care au influențat (pozitiv sau negativ) implementarea strategiei și rezultatele obținute?

Până la data finalizării acestui raport de evaluare finală, luna august 2025, rezultatele obținute de Asociația GAL Iași Sud-Vest privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală sunt foarte bune

Rezultate implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Iași Sud-Vest au fost influențate de factori interni și externi, cei mai importanți fiind:

- **Respectarea principiilor LEADER**
- **Calitatea animării**
- **Funcționarea parteneriatului, inclusiv a CD și CS**
- **Experiența exercițiului anterior**
- **Imaginea GAL în teritoriu**
- **Colaborarea cu CDRJ și AM**
- **Colaborarea cu OJFIR/CRFIR**
- **Lipsa de ofertanți pentru execuția lucrărilor cu valoare mică care presupun construcții-montaj**

Considerăm că o importanță majoră privind succesul Strategiei de Dezvoltare Locală a fost respectarea principiilor LEADER și calitatea animării încă de la faza elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală. Actorii locali din teritoriul GAL Iași Sud-Vest au fost implicați activ în luarea deciziilor, în participarea cu idei și sugestii.


- **Monitorizare și evaluare continuă:**

Monitorizarea periodică a progresului implementării strategiei și evaluarea rezultatelor obținute sunt esențiale pentru a identifica eventualele probleme și pentru a face ajustările necesare. Evaluarea continuă permite optimizarea strategiei și asigură că aceasta rămâne relevantă și eficientă pe parcursul implementării.


Organele decizionale ale Asociației GAL Iași Sud-Vest au fost active și au sprijinit efectiv implementarea SDL.

Un alt factor de succes în implementarea Strategiei de Dezvoltare a Asociației GAL Iași Sud-Vest este experiența exercițiului anterior. Toți membrii echipei GAL (cei 4 angajați ai GAL) au participat la implementarea cu succes a strategiei în exercițiul financiar anterior, 2007-2013.

Din răspunsurilor la chestionare reiese că Asociația GAL Iași Sud-Vest are o imagine bună și foarte bună în rândul actorilor locali, considerând că aceasta este foarte importantă pentru dezvoltarea locală:

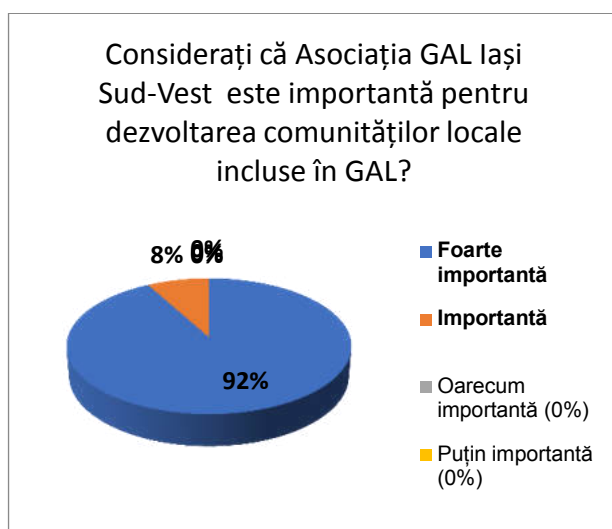


Grafic: Importanța GAL pentru dezvoltarea comunităților locale

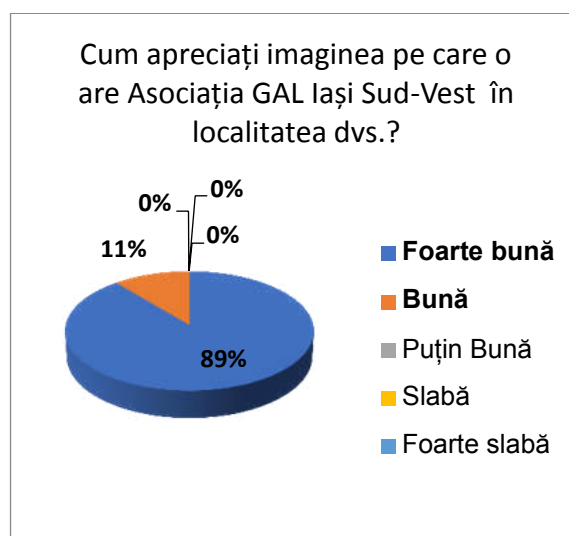

Grafic: Imaginea GAL în teritoriu

- Calitatea discuțiilor : acceptarea dialogului, oferirea de informații utile și corecte

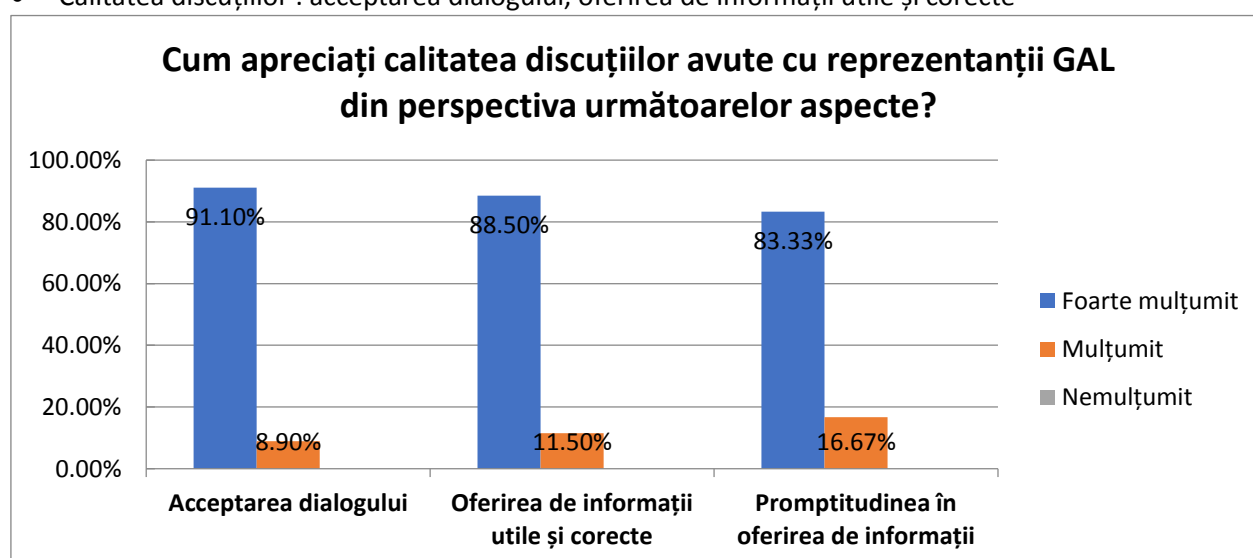

Imaginea Asociației GAL Iași Sud-Vest în cele 14 UAT componente este una foarte bună, gradul de încredere în aceasta fiind unul foarte bun.

CDRJ și AM au fost alături de echipa GAL și au oferit cu promptitudine sprijin și clarificări ori de câte ori a fost necesar.

OJFIR și CRFIR au conlucrat cu echipa GAL la clarificarea unor situații generate de implementarea SDL în baza ghidurilor și procedurilor specifice. S-au semnalat întârzieri în evaluarea și contractare proiectelor la nivel CRFIR cauzate de lipsa de personal.

Pentru investiții care presupun construcții–montaj și cu valori mici este greu de găsit ofertanți pentru execuția lucrărilor.

- **Factori externi neprevăzuți:**

Schimbările economice, politice sau legislative pot afecta negativ implementarea strategiei. Schimbările neprevăzute pot afecta capacitatea de a atinge obiectivele stabilite și pot necesita ajustări ale strategiei.

8. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

I. Logica intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală

1. Logica de intervenție a fost și a rămas foarte relevantă. Principalele nevoi identificate prin analiza SWOT au fost acoperite cu măsuri de finanțare. S-au desfășurat activități de sprijin în vederea atingerii rezultatelor așteptate (pentru toate măsurile s-au elaborat ghiduri ale solicitantului, seturi de proceduri pentru evaluare și selecție, și seturi de proceduri pentru efectuarea conformității DCP). Rezultatele așteptate sunt clar definite și cuantificabile.

II. Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie

1. Teritoriul a manifestat un interes foarte mare pentru modernizarea și re tehnologizarea sectoarelor agricol și non-agricol.
2. Alocările financiare au fost insuficiente comparativ cu cererea teritoriului, atât pentru sectorul agricol cât și pentru cel non-agricol.
3. Segmentul de populație tânără (până în 40 de ani) și femeile sunt cei mai interesați de dezvoltarea și modernizarea afacerilor.
4. Gradul de satisfacție a beneficiarilor în relația cu GAL este foarte ridicat.
5. Implementarea strategiei s-a îndeplinit într-un procent de 100%.

III. Valoarea adăugată datorată metodei LEADER

1. Prin abordarea LEADER capitalul social **s-a îmbunătățit în mare măsură**, s-au schimbat mentalități și a crescut încrederea reciprocă și încrederea în GAL.
2. Implementarea accelerată a strategiei se datorează în principal unei guvernante locale îmbunătățite în **foarte mare măsură**. Partenerii și comunitățile au participat la luarea deciziilor în faza de elaborare a SDL. Comunitățile și partenerii în urma întâlnirilor de lucru succesive (în plen și pe comisii de specialitate) au stabilit prioritățile de dezvoltare ale teritoriului și alocarea bugetelor pe fiecare prioritate.
3. Ca urmare a abordării LEADER sectoarele agricol și non-agricol s-au modernizat și re tehnologizat. Activitatea acestora a devenit **eficientă**.

4. S-a diversificat oferta de servicii și produse competitive.
5. Se pun în valoare resursele naturale locale.
6. S-a creat cadrul propice aplicării de tehnologii prietenoase cu mediul.
7. Crește vizibilitatea și accesibilitatea patrimoniului de mediu, turistic și cultural al teritoriului.
8. Asigură conservarea identității, tradițiilor și meșteșugurilor locale.
9. Încurajează diversificarea domeniilor de activitate ale fermierilor.
10. Încurajează asocierea și crearea cadrului propice pentru transferul de informații.
11. Modernizarea serviciilor publice locale, a infrastructurii de bază și a infrastructurii sociale existente.
12. Contribuie la reducerea/eliminarea efectelor de segregare
13. Stimulează spiritul antreprenorial al tinerilor și femeilor
14. Creează locuri de muncă
15. Crește nivelul de trai și se reduce decalajul rural-urban
16. Teritoriul devine atractiv pentru tineri și investitori.

IV. Factori de succes și de insucces

1. Respectarea principiilor LEADER în faza de elaborare a SDL a facilitat implementarea cu ușurință a acesteia.
2. Calitatea animării a condus la acoperirea rapidă a tuturor măsurilor cu proiecte, unele măsuri fiind chiar supralicite.
3. Parteneriatul, Consiliul Director și Comitetul de selecție au fost foarte active.
4. Experiența exercițiului anterior, imaginea foarte bună și încrederea de care se bucură echipa GAL în teritoriu a facilitat comunicare foarte bună cu teritoriul și a ușurat implementarea.
5. Colaborarea promptă și eficientă cu CDRJ și AM.
6. Colaborarea, în general bună cu OJFIR/CRFIR (lipsa de personal la nivel CRFIR a dus uneori la întârzieri în evaluarea și contractarea proiectelor).

V. Contribuția la dezvoltarea locală

1. Încă din faza de elaborare a SDL s-a acordat atenția cuvenită dezvoltării locale.
2. Serviciile și infrastructurile locale au fost îmbunătățite/modernizate.
3. Prin proiectele depuse aplicații își asumă crearea de locuri de muncă.
4. Decalajul rural-urban s-a redus.
5. UAT-urile, aproape în totalitate, nu sunt satisfăcute de bugetele alocate pe măsurile din această arie de intervenție.
6. Tendința UAT-urilor prin reprezentanții lor legali de a monopoliza bugetul SDL în defavoarea investitorilor privați.
7. Investițiile care au vizat această arie s-au realizat în beneficiul întregii populații, a agenților economici și a instituțiilor publice din teritoriul GAL.

Recomandări generale

La data redactării Raportului de evaluare **toate proiectele contractate sunt finalizate.**

1. Echipa GAL s-a focusat pe monitorizarea proiectelor care sunt în faza de implementare, în legătură cu dinamizarea procesului de implementare.
2. S-a acordat atenție specială monitorizării proiectelor ce presupun construcții-montaj pentru care beneficiarii au propus modificări de soluții tehnice.
3. Rezultatele implementării SDL au fost făcute cunoscute în permanență în teritoriu.
4. S-a verificat și s-a intervenit pentru respectarea utilizării elementelor de identitate vizuală de către toți beneficiarii.
5. În atenția GAL a stat în permanență promovarea beneficiilor abordării LEADER și preocuparea pentru îmbunătățirea imaginii și creșterea încrederii în GAL.
6. Relația beneficiar-consultant ar trebui reglementată în sensul asumării răspunderii consultanților până la finalizarea proiectelor pe care le elaborează.

Lecții învățate

1. Capacitatea de a lucra în parteneriat și calitatea parteneriatului se reflectă în rezultatele implementării SDL.
2. Partenerii și echipa tehnică trebuie să fie respectați, cunoscuți și apreciați în teritoriu pentru întreaga lor activitate.
3. Un SDL realist pliat pe nevoile zonei fără elemente de formalism asigură succesul implementării.
4. Organizarea, coordonarea și controlul activităților prevăzute în SDL este o verigă importantă în procesul de implementare a SDL.
5. Transparența acțiunilor și o animare mergând în profunzimea comunității facilitează acoperirea cu proiecte a măsurilor de finanțare
6. Proceduri și criterii clare ușurează atât munca beneficiarilor, cât și cea a echipei GAL.
7. Însăși realizarea evaluării SDL este o lecție învățată.

Concluzia și răspunsul general privind evaluarea SDL:

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Iași Sud-Vest s-a realizat cu rezultate foarte bune.
